

Projeto de Educação Ambiental da Costa Verde

1º Relatório Anual Consolidado

Programa de Educação Ambiental de São Paulo (PEA-SP) Processo IBAMA: 02022.002921/2009

Programa de Educação Ambiental do Rio de Janeiro (PEA RIO) Processo IBAMA: 02022.001467/2010



E&P

Revisão 00
Abril/2018

 **PETROBRAS**

SUMÁRIO

I	INTRODUÇÃO	1
I.1	Recorte Espacial	1
II	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	1
II.1	Inserção Comunitária	3
II.1.1	Análise Documental e Articulação Institucional	3
II.1.2	Visitas Exploratórias	4
II.1.3	Reuniões de Retomada	4
II.2	Ações Formativas Estruturantes	6
II.2.1	Reuniões com as Comissões	7
II.2.2	Ações Formativas	8
II.3	Etapa Transversal	10
II.3.1	Oficinas de Alinhamento Conceitual, Preparação para Campo e Formação Continuada da Equipe Executora	11
II.3.2	Mobilização.....	16
II.3.3	Processo de Fortalecimento.....	17
III	LIMITAÇÕES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO	18
III.1	Pontos de Atenção	18
III.1.1	Limitações do escopo de atuação e incremento da Equipe Executora	18
III.1.2	Comunidades não incluídas no PEA	20
III.1.3	Comunidades com problemas com o PAPP	21
III.1.4	Comunidades de Mangueira e Ilha das Cobras em Paraty	21
III.2	Pontos de Melhoria.....	22
III.2.1	Comunidades que não Participaram das Ações Formativas.....	22
III.2.2	Estratégias de Mobilização.....	23
III.2.3	Substituição da Orientação Pedagógica	25
III.2.4	Incremento Estrutural da Equipe de Campo.....	25
IV	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO EDUCATIVO E RESULTADOS	25
V	TÉCNICOS RESPONSÁVEIS.....	28

ANEXOS

ANEXO I – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES DO PROJETO

ANEXO II – CRONOLOGIA DOS EVENTOS DO PROJETO

ANEXO III – QUADRO DE INSTITUIÇÕES CONTATADAS

ANEXO IV - COMUNIDADES QUE NÃO PARTICIPARAM DAS AÇÕES FORMATIVAS

I INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o 1º Relatório Anual do Projeto de Educação Ambiental da Costa Verde – PEA Costa Verde, correspondendo ao período que vigorou entre março de 2017 e fevereiro de 2018. Por sua vez o presente Projeto está sob regionalização de dois Programas de Educação Ambiental, o PEA SP para os municípios do Estado de São Paulo (Região 3) e o PEA-Rio para os municípios do Estado do Rio de Janeiro (Região 4).

I.1 RECORTE ESPACIAL

O PEA contempla 69 comunidades, envolvendo os municípios de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, no Estado de São Paulo e Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, no Estado do Rio de Janeiro. O **Anexo I** apresenta a localização das comunidades.

II ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Durante esse primeiro ano de PEA CV (de março de 2017 a fevereiro de 2018) foram realizadas todas as atividades previstas para a Etapa de Inserção Comunitária e iniciou-se a Etapa de Ações Formativas Estruturantes, além das atividades de Formação Continuada da Equipe Executora. O **Anexo II** traz a relação cronológica dos eventos realizados nos 12 meses entre março de 2017 e fevereiro de 2018, além da Oficina de Alinhamento Conceitual da equipe executora, que aconteceu em novembro de 2016. Ressalta-se que algumas das atividades realizadas, como Articulação Interinstitucional, Visitas Exploratórias e Mobilização não foram descritas nesse anexo, por não se constituírem eventos, com horário de início e término definidos.

O cronograma resumido a seguir apresenta como as ações específicas previstas em cada uma das Etapas se distribuíram ao longo desse ano. Por se tratar de um PEA complexo, envolvendo um grande número de comunidades, algumas com dificuldade de acesso, as ações não ocorreram de forma sistematicamente ordenadas e sim orgânicas e fluidas no tempo – mas sempre de acordo com a sequência pré-estabelecida. Ou seja, a mudança de uma atividade para outra (ex.: das visitas exploratórias para a mobilização e desta para as reuniões de retomada) não aconteceu de forma estanque, no mesmo período em todas as comunidades.

Quadro II-1 – Cronograma das atividades do projeto – março/2017 a fevereiro/2018.

Principais Atividades	2017										2018	
	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Planejamento	[Green bars]											
Relatório	[Dark Green bars]											
Reuniões Preparatórias	[Orange bars]											
Mobilização	[Blue bars]											
Visitas Exploratórias	[Yellow bars]											
Reuniões de Retomada	[Red bars]											
Reunião com as Comissões	[Orange bars]											
Ações Formativas	[Purple bars]											
Oficina de Formação Continuada	[Brown bars]											
Etapas	1ª Etapa - Inserção Comunitária					2ª Etapa - Ações Formativas Estruturantes					Recesso de Verão	

Legenda:

	Planejamento
	Relatório
	Reuniões preparatórias
	Oficina de Formação Continuada
	Mobilização
	Visitas Exploratórias
	Reuniões de Retomada
	Reuniões com as comissões
	Ações Formativas

Constata-se que, em relação aos custos empregados, o fluxo de caixa do projeto é saudável até o momento e vem sendo adimplido conforme execução físico-financeira prevista.



Coordenador da Equipe



Técnico Responsável

1º Relatório Anual
PBS09RC20

Revisão 00
04/2018

II.1 INSERÇÃO COMUNITÁRIA

A etapa de Inserção Comunitária consistiu na retomada do contato com as comunidades participantes do PEA. Ela foi composta por quatro atividades: Análise Documental, Articulação Interinstitucional (ambas representadas na atividade de planejamento no cronograma), Visitas Exploratórias e Reuniões de Retomada (RR). Entre essas atividades foi realizada a Oficina de Preparação para o Campo, que faz parte da Etapa Transversal (**item II.3.1**) do projeto e que teve por objetivo preparar a equipe para a execução das atividades nas comunidades.

Por se tratar de um trabalho sequencial, o encadeamento e articulação das atividades é o que permite o melhor desenvolvimento de atividades posteriores e a eficiência do processo como um todo. Portanto, durante essa etapa, a equipe executora trabalhou de maneira a coordenar a reinserção do PEA na região e a sequência das atividades com as particularidades de cada comunidade.

Ressalta-se que o detalhamento das ações realizadas nessa etapa foi apresentado em Relatório específico sobre a Retomada do Relacionamento, protocolado por meio da Carta UO-BS 0859/2017, em 05/12/2017.

II.1.1 Análise Documental e Articulação Institucional

A Análise Documental e a Articulação Interinstitucional tiveram como objetivo conhecer as ações em andamento, identificar demandas atualizadas e dificuldades, conflitos e ações que têm sido bem-sucedidas na região; além de apresentar o PEA para possíveis instituições parceiras. Desse momento começaram a se estabelecer as possibilidades de parcerias para o desenvolvimento do PEA a partir de uma rede de colaboradores. Foram contatadas ao todo 76 instituições entre associações comunitárias, colônias de pesca, prefeituras e secretarias, instituições de ensino e pesquisa, unidades de conservação, entre outras. O **Anexo 03** apresenta quadro com as instituições contatadas nesse período.

Destaca-se que essa é uma atividade permanente, de maneira que as equipes de campo estão frequentemente articuladas com as instituições e, no caso de instituições-chave, esse contato mantém-se para o alinhamento de agendas e ações no território.

II.1.2 Visitas Exploratórias

As visitas exploratórias foram realizadas em todas as comunidades participantes do PEA. Elas se desenvolveram a fim de identificar as lideranças e interessados em compor o grupo de apoio para organização das Reuniões de Retomada (RR) e de mobilizar os comunitários para a participação e identificação de demandas iniciais, dificuldades e necessidades para a organização logística das RR (preparo de lanche com produtos locais, local de trabalho adequado, organização do espaço físico).

Foram contatadas 420 pessoas nas Visitas Exploratórias realizadas em todas as comunidades participantes do projeto. Durante esse período a equipe executora esteve atenta para a aceitabilidade das comunidades em receber o PEA, a fim de observar possíveis resistências para, posteriormente, elaborar a melhor maneira de trabalhá-las.

II.1.3 Reuniões de Retomada

As RR representam o fim da etapa Inserção Comunitária do PEA e também o início formal do PEA Costa Verde nas comunidades. Trabalhando de acordo com as particularidades e disponibilidade de cada comunidade, bem como com as condições logísticas e climáticas adversas, a equipe executora finalizou as RR em julho de 2017.

Essas reuniões tiveram, salvo exceções, a duração de 2 a 4 horas. Os objetivos das RR eram: apresentação do PEA Costa Verde a partir da explicação dos antecedentes que levaram a sua conformação atual e da devolutiva do DP com a entrega do material impresso; compreensão e levantamento de expectativas de cada comunidade; validação ou redefinição de tema gerador e subtemas, bem como a priorização deles para as Ações Formativas Estruturantes e a organização das Comissões Comunitárias. A condução de cada uma das RR foi baseada em Roteiros Pedagógicos, desenvolvidos por cada uma das duplas que compõem a equipe executora.

Os Supervisores com apoio dos Técnicos de Campo conduziram as RR a partir de uma diversidade de estratégias pedagógicas, conforme alinhado com a orientadora pedagógica, utilizando-se de cartazes, grupos de trabalho, plenária e etc. - tudo desenvolvido com uma linguagem acessível de forma a favorecer a participação de todos.

Foram realizadas 66 reuniões de retomada contando com 1032 participantes, uma média geral de 16 participantes por reunião.




Coordenador da Equipe




Técnico Responsável

1º Relatório Anual
PBS09RC20

Revisão 00
04/2018

O gráfico abaixo (*Figura II.1.3-1*) apresenta as avaliações das RR pelos participantes com relação aos itens específicos. É possível observar um equilíbrio entre os aspectos e que foram avaliados principalmente de forma ótima.

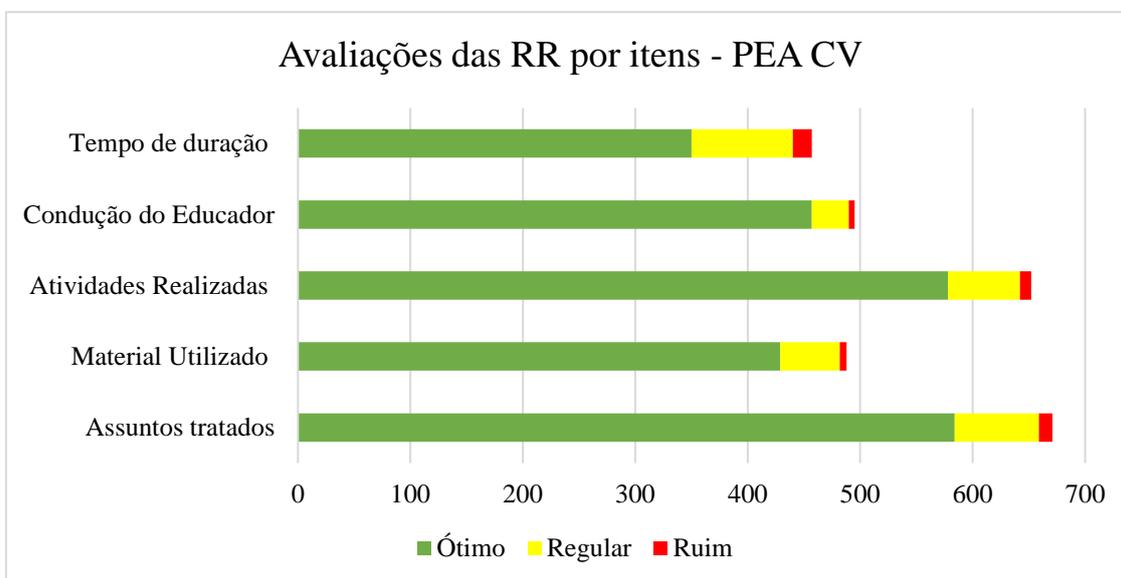


Figura II.1.3-1 - Avaliações das RR por itens

Aponta-se aqui uma questão estrutural em relação ao planejamento da Etapa de Inserção Comunitária. Notadamente foram propostos demasiados objetivos para serem alcançados durante a RR, essa é mais uma questão que atuou contra o tempo de realização da atividade. Sobretudo, identificou-se posteriormente um prejuízo em relação ao uso dos Temas Geradores. Essa questão será melhor explorada no **item III.2.4** que trata do Monitoramento e Avaliação do Projeto.

Nas RR foram definidos temas de interesse por parte dos comunitários para desencadear as Ações Formativas, considerando a metodologia de desenvolvimento dos Temas Geradores.

Diversos temas foram levantados durante o processo e então agrupados em prioritários (base para a 1ª Ação Formativa (AF) em cada comunidade) e secundários (assuntos associados aos prioritários, que seriam trabalhados sequencialmente).

Foram identificados 30 subtemas nas 66 comunidades que, após análise aprofundada, foram agrupados por afinidade, identificando assim 6 (seis) blocos temáticos. A

quantidade de vezes que os blocos temáticos foram apontados como prioritários em cada conjunto de comunidades é indicada no *Quadro II.1.3-1*:

Quadro II.1.3-1 – Número de comunidades por bloco temático prioritário

TEMAS PRIORITÁRIOS	Total
Regularização (Habilitações), Legislação e Fomento Pesca/Maricultura	44
Gestão do Território e Instrumentos de Regularização Fundiária	17
Organização Comunitária	15
Turismo	10
Infraestrutura	13
Licenciamento de Grandes Empreendimentos	3

Ressalta-se a predominância dos conteúdos relacionados à cadeia produtiva da pesca artesanal e aos instrumentos de gestão/regularização do território, correspondendo ambos aos objetivos centrais do PEA Costa Verde.

Nota-se, também, que as questões relacionadas ao licenciamento ambiental de grandes empreendimentos, por ora, não ocupam as prioridades para as comunidades.

II.2 AÇÕES FORMATIVAS ESTRUTURANTES

As Ações formativas estruturantes constituem a segunda e principal etapa do PEA, pois é onde serão desenvolvidas ações de caráter permanente. Tais ações têm como objetivo geral a instrumentalização do público prioritário para o acompanhamento, nas arenas públicas, dos processos em curso e encaminhamento de seus direitos e demandas, isto é, o fortalecimento para intervenção social qualificada.

A partir do contexto de cada comunidade e do tema gerador escolhido por ela, são desenvolvidas ações formativas com o objetivo de possibilitar uma análise conjunta da realidade. Nessa prática educativa, equipe executora e público prioritário do processo educativo se tornam investigadores da realidade, com o propósito de melhor compreender para intervir de forma qualificada e estratégica.

Não há uma quantidade ou forma pré-definida de ações formativas a se realizar em cada comunidade, nem mesmo uma frequência, isso vai depender do andamento do projeto e das particularidades de cada comunidade frente aos objetivos que se pretende atingir nessa etapa. Nesse contexto, as reuniões com as comissões representam um espaço importante de articulação para a execução das ações.



Coordenador da Equipe



Técnico Responsável

1º Relatório Anual
PBS09RC20

Revisão 00
04/2018

II.2.1 Reuniões com as Comissões

As comissões comunitárias se formaram, primeiramente, durante as Reuniões de Retomada, mas a sua composição é flexível o suficiente para receber novos moradores interessados em participar mais ativamente dos processos do PEA.

Tais Comissões são um grupo fundamental para ampliar a mobilização de todo o público prioritário ao longo do desenvolvimento do PEA, identificar as demandas de esclarecimento, reflexão sobre problemas, difusão de todas as atividades, planejamento e organização das ações formativas estruturantes, sempre em conjunto com a equipe executora.

Do total de 1032 pessoas que participaram das Reuniões de Retomada, contabilizando todas as comunidades, 384 pessoas se dispuseram a fazer parte das comissões comunitárias do PEA. Este montante corresponde a 37% dos participantes dispostos a se envolverem com o planejamento participativo e execução das atividades no âmbito comunitário.

Durante a Reunião de Retomada, diversas foram as metodologias adotadas pelas equipes de campo a fim de caracterizar e esclarecer o público prioritário do PEA e a partir delas foi possível para os comunitários compreender que todos os envolvidos na cadeia de pesca artesanal na comunidade poderiam participar ativamente do projeto. Dessa maneira, as comissões comunitárias estabelecidas contaram com o engajamento de homens e mulheres, jovens e adultos.

Nesse início da Etapa de Ações Formativas e Estruturantes, as primeiras reuniões com as comissões tiveram como foco principalmente a validação do tema prioritário definido na reunião de retomada, a própria comissão (entrada e saída de integrantes e esclarecimento de dúvidas e compreensão do seu papel dentro do PEA) e a organização das atividades formativas.

Em diversas comunidades foi necessária a realização de mais de uma reunião com a comissão antes da Ação Formativa devido às especificidades das próprias comunidades, mas que de maneira geral, esteve relacionada à necessidade do estabelecimento de um consenso sobre o tema gerador a ser trabalhado nas ações; à repactuação e fortalecimento de estratégias para ampliar a mobilização de comunidades menos engajadas no PEA e à definição coletiva do conteúdo da Ação Formativa.



Coordenador da Equipe



Técnico Responsável

1º Relatório Anual
PBS09RC20

Revisão 00
04/2018

No espaço das reuniões com as comissões comunitárias também foi possível a equipe de campo auxiliar em alguns encaminhamentos da própria comunidade – de questões levantadas ou rearticuladas pelo PEA – como elaboração de documentos, ofícios, cartas e etc.

A intenção de articulação com moradores de outras comunidades participantes do PEA para compartilhamento de experiências bem-sucedidas e trocas de conhecimento destaca-se como um dos encaminhamentos das reuniões com as comissões comunitárias – um aspecto muito interessante não somente para a organização e realização das ações formativas, mas também conformando um subsídio positivo para a próxima etapa do PEA, Intercâmbio de Experiências e Encontros Temáticos, que prevê justamente isso.

Por fim, vale salientar a importância de manter as comissões mobilizadas, uma vez que não há remuneração daqueles participantes. Ou seja, já que a participação dos comunitários é dada de forma voluntária, fazendo com que sua atuação seja dependente de motivações particulares, é importante que o diálogo e as relações mantenham-se ativos, pois é um grupo estratégico para que o PEA possa continuar se desenvolvendo com qualidade e representatividade.

II.2.2 Ações Formativas

Com o fim da Etapa de Inserção Comunitária em Julho de 2017, iniciou-se a Etapa de Ações Formativas e Estruturantes (AF) do PEA CV.

Diferentemente da Etapa de Inserção Comunitária que caminhou em um tempo relativamente similar em todas as localidades, mesmo considerando as características de cada uma e possíveis contratempos, a Etapa de Ações Formativas e Estruturantes tem dependido fortemente em maior grau das especificidades de cada comunidade.

Dessa maneira dois aspectos são importantes: considerar que as ações estão se desenvolvendo de forma mais esparsa no tempo e a importância do alinhamento e facilitação da equipe executora do PEA.

Conforme já apresentado, as AF têm caráter estruturante e permanente no PEA, aspectos que demonstram sua importância dentro do processo e a necessidade de trabalhá-las especificamente – de acordo com o contexto de cada comunidade e tomando-o como ponto de partida.

Quanto mais o público prioritário compreende o contexto em que está inserido, em suas diferentes escalas, bem como as diversas arenas de tomada de decisão determinantes desse contexto, tanto mais resiliente e capaz de gerar estratégias de adaptação às mudanças e de construir alternativas.

Assim, a equipe de campo tem trabalhado durante as Ações Formativas no sentido de dispor de ferramentas que propiciem condições para que a própria comunidade comece a desenvolver ou aprimore a leitura dos aspectos socioeconômicos e culturais de seu território por meio dos temas prioritários estabelecidos.

A fim de orientar as ações, foi desenvolvido um roteiro metodológico para a realização das AF de acordo com a perspectiva teórica da educação ambiental crítica que fundamenta esse projeto e a partir do olhar aos aspectos sutis e da escuta sensível advinda das relações estabelecidas com cada uma das comunidades trabalhadas.

Entre outubro e dezembro de 2017, foram realizadas 57 Ações Formativas que contaram com a presença de 794 comunitários. Ressalta-se que 84% das pessoas que foram mobilizadas puderam comparecer à reunião.

Só não foi possível realizar AF nas seguintes comunidades: Bonete e Barra dos Pescadores em Ubatuba/SP; Centro/Pontal/Chácara, Paraty-Mirim, Trindade, Praia do Sono, Ponta Grossa e Mangueira¹ em Paraty/RJ; Ilha da Marambaia e Conceição de Jacaré em Mangaratiba/RJ. As justificativas e os encaminhamentos para cada uma delas estão descritos no **item III.2.1**.

Ao final das AF foram entregues avaliações para os participantes a fim de obter o retorno de cada um deles. Os seguintes critérios foram avaliados: assuntos tratados, material utilizado, condução dos educadores, atividades realizadas, entendimento do conteúdo. Para cada um desses critérios os participantes puderam avaliar como: ótimo e não mudaria nada, regular e faria diferente e ruim e mudaria completamente.

O **Quadro II.2.2-1** apresenta os resultados compilados dessas avaliações, as quantidades nele dispostas referem-se à totalidade de avaliações recebidas considerando todas as perguntas, isto é, todos os aspectos avaliados. De maneira geral é possível observar que a maioria das respostas nas avaliações das Ações Formativas foi positiva, pois em 89% das avaliações foi atribuído o critério ótimo para os itens avaliados.

¹ O trabalho do PEA na comunidade de Mangueira foi descontinuado. Esse ponto está esclarecido no **Item V.4**

Quadro II.2.2-1 – Relação geral das avaliações das AF feitas pelos comunitários

Equipe Executora	Ótimo 	Regular 	Ruim 
PEA CV	89% (1811)	10% (195)	1% (28)

Considerando todas as comunidades do PEA, o quesito mais bem avaliado foi a condução do educador seguido dos assuntos tratados, e o pior avaliado foi o tempo de duração.

Essas informações trazem um retorno positivo importante para a atuação das equipes executoras em campo e, ao mesmo tempo, que o conteúdo das reuniões foi interessante para as comunidades.

Dois aspectos são importantes e devem ser aqui salientados: apesar de muitos já compreenderem que não é esse o objetivo do projeto, alguns comunitários ainda veem no PEA a oportunidade de solucionar os problemas comunitários de imediato, por isso entendem que as reuniões nunca são o suficiente; por outro lado existem também aqueles comunitários que alegaram que os temas trabalhados são complexos de entendimento e tratamento e que a equipe demora muito a voltar à comunidade necessitando, portanto, de mais reuniões.

Na prática, o tempo é um recurso comumente escasso quando são defrontados os objetivos de aprendizagem a serem atingidos pelos educandos frente aos objetivos estabelecidos para a concretização do ato pedagógico. Desta maneira, com a orientação pedagógica e coordenação técnica do PEA, os procedimentos metodológicos são constantemente planejados, revisados e adaptados de forma a buscar a compatibilização com o tempo disponível, sem que resulte no sacrifício dos objetivos de aprendizagem.

II.3 ETAPA TRANSVERSAL

Consiste nas atividades que se realizam de maneira permanente e independente das demais etapas.

II.3.1 Oficinas de Alinhamento Conceitual, Preparação para Campo e Formação Continuada da Equipe Executora

A realização das Oficinas de Formação Continuada da Equipe Executora – OFCEE, garantem espaço para formação e articulação permanente entre as equipes de educadores e agentes sociais, com instrumentalização para desenvolvimento de todas as etapas previstas no PEA, avaliação constante e adequação das ações.

Apesar de orientadas para a equipe de campo essas oficinas contam com a importante participação da Petrobras e do Ibama.

Ao longo dos últimos 12 meses de PEA foram realizadas 5 oficinas com as seguintes temáticas principais contempladas: I) Oficina de preparação de campo; II) Licenças de pesca e navegação, Gestão Ambiental do Território; III) Licenciamento de empreendimentos Offshore e Educação Ambiental Transformadora no Contexto do Licenciamento Ambiental; III) Educação Ambiental Crítica, revisão de conceitos teórico-metodológicos e objetivos do PEA e discussão de incremento da equipe executora e IV) Royalties: definição, distribuição e controle social.

Ressalta-se a realização de uma Oficina de Alinhamento Conceitual, ainda em novembro de 2016, portanto, antes do início efetivo do projeto. Tal Oficina teve como objetivo reunir a então futura equipe executora para apresentar e discutir os princípios básicos que orientam os Projetos de Educação Ambiental, do ponto de vista conceitual e das ferramentas pedagógicas, alinhados à Educação Ambiental Crítica, constituindo ambiente de ensino-aprendizagem de caráter dialógico, participativo, horizontal, interdisciplinar e de troca de saberes.

OFICINA DE PREPARAÇÃO PARA O CAMPO

A fim de preparar a Equipe Executora para iniciar as *Ações de Inserção Comunitária* foram realizadas, no período de 14 de março a 5 de abril de 2017, as Reuniões Preparatórias e a Oficina de Preparação para o Campo. Essa oficina foi realizada com o objetivo de instrumentalizar a equipe para apresentar o PEA Costa Verde a cada comunidade envolvida, com base nos princípios da Educação Ambiental Crítica.

As Reuniões Preparatórias foram realizadas em 14 e 15 de março entre a coordenação do projeto, a orientadora pedagógica e os Supervisores e Técnicos da equipe executora. Nelas foi apresentado o Plano de Trabalho, detalhadas as atividades de inserção

comunitária (compreendendo as tarefas que lhes são devidas, mas também a preparação dos Agentes Sociais e aspectos administrativos e de logística), bem como a preparação da programação da Oficina de Preparação para o Campo.

As Oficinas de Preparação para o Campo foram realizadas nos dias 28 e 29 de março de 2017 com os integrantes da equipe responsáveis pelas comunidades dos municípios de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba e nos dias 4 e 5 de abril de 2017 com as equipes responsáveis pelas comunidades dos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba. As oficinas contaram com todos os membros da equipe técnica da Mineral, técnicos do Ibama e técnicos da Petrobras.

Por meio de metodologias ativas e apresentação dialogada foram desenvolvidos os seguintes tópicos específicos: empreendimentos de Petróleo e Gás (realizado pelo Ibama); programa de ação participativa para a pesca – PAPP (realizado pela Petrobras); Fórum de Comunidades Tradicionais (FCT) e Observatório dos Territórios Saudáveis e Sustentáveis da Bocaina (OTSS) (realizado por integrantes do FCT e do OTSS); Projeto de Educação Ambiental da “Costa Verde” (realizado pela orientadora pedagógica e coordenação técnica); Diálogo de Retomada (Assessor de Comunicação) e Planejamento das ações de inserção comunitária (equipe da Mineral).

A Oficina foi avaliada como proveitosa e participativa. Entende-se que os objetivos pretendidos foram cumpridos de modo a afirmar que a Equipe Executora estava em condições de iniciar as atividades em campo.

1ª OFICINA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE EXECUTORA

A 1ª OFCEE teve como objetivo Preparar a Equipe Executora para iniciar a 2ª Etapa - Ações Formativas Estruturantes, instrumentalizando-a para desencadear a abordagem dos temas geradores de cada comunidade, identificados na 1ª Etapa de Inserção Comunitária.

A oficina foi realizada na sede do Núcleo Picinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar – PESM, em Ubatuba, São Paulo, entre os dias 08 e 10 de agosto de 2017. Contou com 16 horas de duração e participação de 46 pessoas, sendo: 40 integrantes da Equipe Executora do PEA, Coordenador Geral, Coordenadora Estratégica, Orientadora Pedagógica, duas técnicas volantes, três Assistentes, cinco Supervisoras, cinco Técnicos

de Campo e 18 Agentes Sociais), além de seis técnicos da Petrobras e palestrantes convidados.

Com as avaliações dos participantes concluiu-se que a Oficina contribuiu para instrumentalizá-los para o desenvolvimento dos temas “Habilitações, permissões e registros” e “Pesca Artesanal”, assim como alguns subsídios significativos também foram trabalhados sobre aspectos da “Gestão Territorial”, com enfoque nos instrumentos jurídicos para formulação de acordos de uso do território e dos recursos.

Entendeu-se que o desdobramento do 1º Ciclo da 2ª Etapa (agosto/2017 a março/2018) em diversas atividades sequenciadas, com cronograma formulado em conjunto com Supervisores e Técnicos, na Reunião Preparatória, foi de suma importância para atender à necessidade de adequação do planejamento à realidade de campo, vivenciada na 1ª Etapa. A apresentação desse novo cronograma para o conjunto da equipe, no formato que foi realizado, auxiliou bastante para se alcançar maior entendimento dos próximos passos do processo.

Ficou evidente também que a Equipe Executora está bastante engajada nos PEAs e compromissada com o atendimento das demandas das comunidades, bem como fortalecida para buscar aprofundamentos nos temas que se fazem necessários, com a necessária iniciativa e autonomia, orientadas pelos subsídios fornecidos.

A Oficina também foi importante para que a Equipe, a Coordenação dos PEAs e a Petrobras refletissem, de forma conjunta, sobre a inserção do tema “Licenciamento da Etapa 3 do Pré-Sal”, no processo formativo como um todo (tanto da própria equipe, como das comunidades). Foram definidos passos importantes a esse respeito, bem como, identificados os desafios e necessidades de ajustes.

2ª OFICINA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE EXECUTORA

A 2ª OFCEE foi realizada no dia 19 de setembro de 2017, em Angra dos Reis – RJ, e contou com a participação de 41 pessoas, sendo: 34 integrantes das Equipes Executoras dos PEAs (incluindo Coordenador Geral, Coordenadora Estratégica, Orientadora Pedagógica, 01 Volante, 03 Assistentes, 05 Supervisores de Campo, 04 Técnicos de Campo e 18 Agentes Sociais), 4 representantes da Petrobras e 3 convidados.

A oficina tinha como objetivo a formação sobre os procedimentos de Licenciamento Ambiental dos Empreendimentos Marítimos de Exploração de Petróleo e



Coordenador da Equipe



Técnico Responsável

1º Relatório Anual
PBS09RC20

Revisão 00
04/2018

Gás, de modo a instrumentalizá-las para a preparação de Ações Formativas. Dividida em três temas, Empreendimentos Marítimos da Petrobras, Licenciamento de Empreendimentos Offshore e Educação Ambiental Transformadora no contexto do Licenciamento Ambiental, as atividades se desenvolveram ao longo de 8 horas.

De maneira geral o objetivo da 2ª Oficina de Formação Continuada da Equipe Executora foi atingido, entretanto, foram observados alguns pontos de melhoria e identificados outros temas para aprofundamento².

Dentre os pontos de melhoria, destacaram-se: questões relativas ao tempo disponível para a atividade (reduzido) frente à complexidade dos assuntos tratados, devendo ser repensada essa relação de modo a ficar equilibrada na próxima oficina; a linguagem utilizada e a necessidade de que ela seja acessível à compreensão de todos os sujeitos participantes da oficina; algumas demandas para preparação da equipe para as Ações Formativas e questões organizacionais de logística e alimentação.

Por fim, cabe salientar a participação e o entrosamento das Equipes Executoras. Apesar de algumas especificidades, as equipes participaram ativamente da oficina na medida em que o espaço foi possibilitado e mostraram-se bastante atentas e interessadas nas atividades como um todo. Além disso, percebeu-se que com o passar do tempo tornaram-se mais integradas entre si.


Para o desenvolvimento do PEA, tais atributos observados são importantes para fundamentar e subsidiar adequações, mudanças e permanências na construção mais alinhada e efetiva do projeto em cada uma das comunidades.

3ª OFICINA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE EXECUTORA


Nos dias 19 e 20 de dezembro de 2017 no Núcleo Picinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar em Ubatuba-SP foi realizada a 3ª Oficina de Formação Continuada da Equipe Executora do PEA Costa Verde.

² Educação Ambiental transformadora no contexto do licenciamento ambiental; Etapa 3 dos Empreendimentos Integrados do Pré-Sal; Avaliação de impactos ambientais e sociais cumulativos; Participação popular em audiências; *Royalties*; Partilhas e concessões para exploração de petróleo e gás; Ação formativa e metodologia; Sistemas de regularização fundiária; Conselhos Consultivos e Deliberativos de Unidades de Conservação; Maricultura; Associativismo e Conflitos internos nas comunidades.




Coordenador da Equipe




Técnico Responsável

1º Relatório Anual
PBS09RC20

Revisão 00
04/2018

Contou com a presença das equipes de campo (apenas supervisores e técnicos), coordenadores geral e estratégico e orientadora pedagógica do projeto e equipe da Petrobras.

Desenvolvida pela orientadora pedagógica e pela coordenação técnica do projeto, as atividades foram conduzidas por eles e também pelo Prof. Dr. Carlos Frederico B. Loureiro e divididas em dois dias com dois focos diferentes para cada um deles.

O primeiro dia de formação objetivou fazer um mergulho na educação popular (seus conceitos, métodos, aproximações teóricas) e refletir sobre o processo experienciado em campo, ou seja, sempre com o paralelo na prática de acordo com a metodologia: ação – reflexão – ação. Ou seja, entendendo a avaliação como parte do processo.

Respeitando todo o trabalho que havia sido feito até o momento da oficina, as equipes foram orientadas a revisitar os objetivos de um PEA condicionante de licenciamento P&G, de maneira a esclarecer e esmiuçar quais os limites e capacidades. Depois foram direcionadas a trazer essa reflexão para o PEA Costa Verde, passando pelos objetivos que ele se propõe cumprir realizando uma análise crítica.

O exercício do primeiro dia foi pensar além das estratégias específicas para cada uma das realidades, mas sim o olhar para o projeto em conjunto, visualizando todo o processo de ensino e aprendizagem.

A partir de todo o embasamento formulado no primeiro dia, no segundo dia o trabalho se desenvolveu estritamente ligado à realidade do campo. As equipes foram estimuladas a pensar em ajustes, a partir de uma visão coletiva do projeto como um todo, equilibrando necessidades que entendiam indispensáveis para o seu trabalho frente aos limites e possibilidades de capacidade financeira e logística do projeto (apresentados pela coordenação do projeto) e a partir de um alinhamento conceitual, estratégico e tático (redesenho das atividades, conexões dos temas geradores e etc).

4ª OFICINA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE EXECUTORA

Nos dias 21 e 23 de fevereiro de 2018 foi realizada a 4ª Oficina de Formação Continuada da Equipe Executora do PEA Costa Verde, em Caraguatatuba-SP e Paraty-RJ respectivamente. No dia 21/02 a Oficina foi dedicada às equipes que trabalham nos municípios de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba e no dia 23/02 para as equipes que trabalham nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba.



Coordenador da Equipe



Técnico Responsável

1º Relatório Anual
PBS09RC20

Revisão 00
04/2018

Contou com a participação de toda equipe de campo (Supervisores, Técnicos e Agentes Sociais), coordenação geral e estratégica do projeto, orientação pedagógica, equipe da Petrobras e Ibama.

Com o objetivo de compreender melhor a temática dos Royalties do petróleo, assunto bastante técnico e complexo, a oficina se desenvolveu a partir de apresentações mais expositivas e atividades dinâmicas e práticas.

Iniciou-se a partir da definição e como é feita a distribuição e cálculo dos royalties para depois tratar de suas formas de uso, impactos e controle social. Na parte prática, as equipes participaram de um exercício que propôs, a partir de um Estudo de Caso real, a reflexão e melhor entendimento de todos esses aspectos.

Para contribuir com uma formação mais técnica, específica e qualificada, a oficina foi conduzida como um todo pela orientadora pedagógica e as exposições e dinâmicas por especialistas, Diego Frade de Almeida (representante Técnico da Agência Nacional de Petróleo) e pelo Prof. Carlos Gustavo Smiderle da UENF – Universidade Estadual do Norte Fluminense.

II.3.2 Mobilização

As ações de mobilização são permanentes e transversais a todo o processo, com vistas a garantir a participação do maior número possível de pessoas do público prioritário em todas as atividades previstas bem como organizar detalhes que ainda se façam necessários para a execução da atividade.

As visitas são realizadas principalmente pelos Agentes Sociais, mas a mobilização é reforçada por toda a equipe de campo nos encontros cotidianos, grupos nas redes sociais, nos grupos de aplicativos de mensagens, e outras situações.

Não há participação sem mobilização, é importante que haja motivação individual dos comunitários e a consequente mobilização coletiva do grupo para que as atividades do PEA sejam desenvolvidas com mais qualidade - por isso o trabalho da equipe de campo é constante.

MOBILIZAÇÃO PARA AS REUNIÕES DE RETOMADA

As visitas de mobilização para as Reuniões de Retomada foram realizadas prioritariamente pelos Agentes Sociais, três a sete dias antes da data da RR em cada




Coordenador da Equipe




Técnico Responsável

1º Relatório Anual
PBS09RC20

Revisão 00
04/2018

comunidade. Com a finalidade de ter presente nestas reuniões principalmente o público prioritário, a estratégia da equipe executora se desenvolveu de forma objetiva e direta a partir da entrega de convites individuais e da distribuição e afixação de folhetos e cartazes em locais acordados com as lideranças comunitárias.

Durante essa atividade buscaram trabalhar da forma mais interativa possível com os sujeitos envolvidos de forma a estabelecer os laços de confiança com o projeto.

Foram afixados 263 cartazes em locais selecionados pelas equipes executoras em comum acordo com as lideranças das comunidades. Foram escolhidos lugares de maior circulação: escolas, associações de moradores, pontos de comércio, restaurantes, igrejas e postos de saúde. Como mobilização direta, foi distribuído um total de 1956 convites.

Em algumas localidades além de entregar convites em mãos, também se contou com o auxílio das lideranças na distribuição do convite e lembrete da realização da Reunião de Retomada. Essa estratégia contribuiu para o aumento da capilaridade e alcance do público prioritário e pode ter contribuído para o número de participantes nas reuniões.

MOBILIZAÇÃO PARA AS AÇÕES FORMATIVAS

A mobilização para as Ações Formativas foi registrada por meio do *Protocolo de mobilização*, contendo as informações da comunidade, data da visita, nome e contato do comunitário, formato de convite (impresso, ligação, whatsapp) e formato do segundo contato para reforço do 1º convite (impresso, ligação, whatsapp). Por fim, os cartazes com a indicação do dia, data, horário e local da AF foram afixados em pontos de maior circulação do público prioritário.

Foi evidenciada a mobilização de 949 pessoas considerando as comunidades pertencentes aos municípios de Ubatuba (134), Caraguatatuba (70), São Sebastião (74), Ilhabela (213), Mangaratiba (76) e Angra dos Reis (as comunidades da Ilha Grande, 277).

As visitas de mobilização foram realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, sempre entre 10 a 3 dias antes da realização da reunião.

II.3.3 Processo de Fortalecimento

O fortalecimento comunitário é pilar para o bom desenvolvimento do PEA e, portanto, o acompanhamento do seu processo de construção continuada, a partir da observação e análise das ações dos comunitários, é de proporcional importância.



Coordenador da Equipe



Técnico Responsável

1º Relatório Anual
PBS09RC20

Revisão 00
04/2018

Ressalta-se que essas ações dos indivíduos e comunidades são aspectos sociais complexos, isto é, não são necessariamente lineares – onde uma ação possui uma reação, em um movimento responsivo direto e bilateral.

De tal forma que por vezes não será possível afirmar que alguma ação ou comportamento tenha se desenvolvido em decorrência de influência e/ou contribuição exclusiva do PEA, pois outros diversos fatores podem ter feito esse papel.

Diante disso, a equipe de campo com apoio da orientação pedagógica e coordenação técnica do projeto, está constantemente monitorando o movimento dos sujeitos e validando as informações para que possam ser registradas de maneira completa.

E por fim, ressalta-se que é preciso considerar que as comunidades do PEA, por diversas circunstâncias, têm desenvolvimentos, envolvimento e tempos distintos e que invariavelmente irão influenciar na quantidade, qualidade e temporalidade das movimentações e saltos qualitativos de cada uma.

Os movimentos de fortalecimento são registrados em relatórios internos específicos, que ficam à disposição para apresentação.

III LIMITAÇÕES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

III.1 PONTOS DE ATENÇÃO

III.1.1 Limitações do escopo de atuação e incremento da Equipe Executora

A partir do início do Projeto em março de 2017, com a atuação efetiva das equipes em campo, tornou-se a cada mês mais evidente a dificuldade da equipe executora em atender ao cronograma planejado em gabinete pela coordenação do projeto.

Ao largo de todas as circunstâncias inerentes de um projeto dessa escala, a equipe executora passou a trazer com frequência a questão do subdimensionamento de profissionais de campo frente ao escopo do projeto. Tal fragilidade estrutural foi colocada ao Ibama e à Petrobras em distintas oportunidades, além de ser pauta frequente das conversas entre a coordenação e a equipe executora e alvo de contínuo exercício de replanejamento das ações.

Atualmente, o Projeto conta com quatro profissionais de supervisão de campo e quatro profissionais técnicos de campo que atuam em duplas, todos com dedicação integral. Integram a equipe 20 Agentes Sociais com dedicação parcial e dois técnicos da Frente de Desenvolvimento Temático, que atuam em todo território com dedicação integral. Essa equipe deve atender um escopo de 69 comunidades de forma presencial e contínua visando atender os objetivos definidos no Plano de Trabalho.

Esse é um trabalho que determinadamente exige planejamento conjunto, articulação contínua, reflexão, capacidade analítica e aprimoramento do conhecimento estrutural sobre o território e temas diversos. Tudo isso implica em tempo, a princípio não previsto de maneira satisfatória, frente à dimensão da equipe. A consequência mais imediata desse limite revela-se no espaçamento das ações previstas e, portanto, menor presença nas comunidades.

Ciente desse cenário, a Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros do Ibama - CGMAC convocou para o dia 6 de novembro de 2017 uma reunião para definição de estratégias de repactuação de compromissos, as quais foram postas em prática logo na sequência, envolvendo a construção do Plano Participativo de Avaliação Estrutural da Equipe de Campo. Tal plano apontou como estratégias reuniões da gerência do Projeto pela Mineral com a Equipe Executora; reuniões entre Gerência de Meio Ambiente da Petrobras, coordenação da Mineral e Equipe executora e a construção conjunta de uma proposta de incremento da equipe executora.


A construção da proposta foi realizada durante a 3ª Oficina de Formação da Equipe Executora em 20 de dezembro de 2017 na sede do Núcleo Picinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar, Ubatuba, SP.

A nova proposta construída com a equipe executora adiciona 4 novas duplas de campo. Cada dupla da equipe executora passará a trabalhar com o escopo de no máximo 11 comunidades e no mínimo 7, o que difere bastante da situação atual onde as duplas trabalham com 15 a 20 comunidades.

A efetivação do incremento da equipe executora, como já argumentado, trará melhores condições de campo, gabinete e formação para a equipe.

A redução do número de comunidades por equipe proverá de imediato maior presença nas comunidades, adequando a intenção pretendida quanto ao número de ações




Coordenador da Equipe




Técnico Responsável

1º Relatório Anual
PBS09RC20

Revisão 00
04/2018

previstas e à presença em eventos culturais e de tomadas de decisão das comunidades. Isso possibilitará que a equipe se mantenha atualizada em relação às discussões regionais e a questões estruturais do território, podendo reduzir resistências ao projeto e aumentar o engajamento das comunidades.

Além disso, serão ampliadas as possibilidades de planejamento conjunto, articulação contínua, reflexão e análise a partir da melhor comunicação com a coordenação e orientação pedagógica.

Melhora-se também a relação institucional do projeto ao possibilitar articulação mais presente com instituições parceiras e reduzir o número de intermediações por equipe.

Por fim, as áreas de atuação apresentarão sensível melhora operacional, reduzindo os deslocamentos e a gestão logística e possibilitando melhor aproveitamento e qualidade do tempo em campo.

Os próximos passos para que a presente proposta de incremento da equipe executora se concretize envolve efetivação de aditivo contratual. Estima-se que apenas a partir do segundo semestre de 2018 os novos técnicos da equipe executora deverão iniciar sua atuação no projeto.

A orientação pedagógica e a coordenação do projeto estarão atentas para necessidade de alinhamento conceitual desses novos profissionais. Será planejado momento de formação, passando pelos principais conceitos da educação popular e outros assuntos tratados nas oficinas de alinhamento conceitual e preparação para o campo, além de trazer informações sobre o desenvolvimento do projeto até o momento.

III.1.2 Comunidades não incluídas no PEA

Ao longo das atividades em campo, a equipe executora pôde observar que muitas comunidades da região que tem a presença do sujeito prioritário não foram contempladas pelo projeto. Tais comunidades já foram relacionadas no Relatório Descritivo e Analítico da Etapa de Inserção Comunitária. Foram levantadas ao todo 94 comunidades não contempladas nos 7 municípios do Projeto, sendo 25 destas mobilizadas de alguma forma pela equipe executora para as atividades realizadas até aqui.

Ressalta-se que a equipe não se ocupou em qualificar as comunidades a partir de qualquer critério, apenas acolheu apontamentos de instituições, lideranças, outros

comunitários e parceiros durante as atividades da presente etapa. Portanto, não somos capazes de julgar a inclusão futura ou não de cada comunidade citada.

III.1.3 Comunidades com problemas com o PAPP

Durante a Primeira Etapa, tanto nas visitas exploratórias como nas reuniões de retomada, as questões vivenciadas pelo Projeto de Ação Participativa para a Pesca (PAPP) vieram à tona. Muitos questionamentos e insatisfações foram colocados, dificultando inclusive o andamento do PEA, pois existe o conflito com a empresa, por conta do PAPP, em algumas comunidades. Porém, nas conversas conduzidas, nenhuma das lideranças se manifestou contra a realização do projeto e nem contra a equipe. Mas, mostraram um descontentamento em relação à Petrobras.

As demandas obtidas durante as visitas exploratórias foram repassadas à Petrobras, para que fosse possível realizar ações para minimizar esse conflito e prestar esclarecimentos referentes ao PAPP. Diante disso, foram agendadas pela Petrobras duas reuniões, nas comunidades de Camaroeiro e Saco da Ribeira, para tratar das questões mais complexas e foi organizada uma breve apresentação para ser repassada no início das reuniões de retomada.

Essa estratégia foi importante para o desenvolvimento do PEA. Porém, ainda não foi suficiente para sanar todas as questões. Em algumas comunidades as demandas e insatisfações ainda estão presentes e são colocadas nos encontros realizados como exemplo ou experiência vivida. Vale destacar que o PAPP não é uma condição para a realização do PEA, se trata de um projeto condicionante realizado de forma participativa e concluído; contudo se deve dar a atenção merecida, para que seja possível dirimir as dúvidas ou insatisfações quanto ao processo realizado nas comunidades.

III.1.4 Comunidades de Mangueira e Ilha das Cobras em Paraty

Os bairros de Mangueira e Ilha das Cobras historicamente abrigam pescadores artesanais, hoje pulverizados em um contexto urbano de extrema violência. Atualmente a prática da pesca é percebida em pequenos territórios pressionados por dinâmicas e estruturas típicas de periferia urbana. A vulnerabilidade desses pescadores passa, antes de mais nada, pelo contexto de pobreza, desigualdade social, violência pelo tráfico de drogas e carência de políticas públicas básicas.

O projeto entende o caráter emergencial de trabalhar com essas comunidades, sobretudo diante da acentuação da condição de vulnerabilidade. Porém, apesar dos bairros abrigarem o público prioritário de pescadores artesanais do projeto, qualquer iniciativa de atuação junto as essas comunidades precisa ser pensada e desenvolvida com muito cuidado, em sintonia com ações especializadas em serviço social e segurança pública.

O contexto de extrema violência exige preparo, treinamento, conhecimentos, habilidades e experiências específicos para o desenvolvimento das atividades que o projeto se propõe que, todavia, são limitações do perfil dos colaboradores escolhidos para compor a equipe executora.

Ainda assim, a equipe executora realizou diversos esforços de relacionamento com essas comunidades, buscando maneiras de se aproximarem do público prioritário e estabelecerem uma forma de trabalho que pudesse reduzir a exposição dos participantes e da própria equipe aos riscos relatados. A baixa participação nas atividades agendadas relevou justamente que existem questões que se sobrepõem aos objetivos que o projeto intenta trabalhar.

Com base nos fatos expostos em carta pela equipe executora para a Coordenação do Projeto, entendemos que não há condições da equipe prosseguir desenvolvendo atividades do PEA nestes dois bairros de Paraty e solicitamos providências para o desligamento dessas comunidades nessa fase do Projeto. Os pescadores artesanais residentes desses bairros poderão participar das atividades do projeto que acontecem em outras comunidades, caso tenham interesse, bem como dos encontros temáticos e regional previstos no projeto.

III.2 PONTOS DE MELHORIA

III.2.1 Comunidades que não Participaram das Ações Formativas

Conforme apresentado no **item II.2.2** desse relatório, em algumas comunidades não foi possível realizar as AF durante os últimos três meses do ano de 2017. Dessa maneira, o **Anexo IV** traz o detalhamento do encaminhamento e/ou situação vivenciada em cada uma dessas comunidades de acordo com o município.

III.2.2 Estratégias de Mobilização

Além das questões particulares de cada comunidade em relação às dificuldades encontradas na mobilização dos comunitários, existem desafios que permeiam as ações de mobilização para toda a equipe executora. Fundamentalmente são três os desafios encontrados: a **resistência** por parte das comunidades em relação a projetos comunitários; a dificuldade de encontrar e **trabalhar com o público prioritário** em áreas onde as comunidades encontram-se pulverizadas, em especial em áreas urbanas, e; em comunidades de público diversificado, **garantir que sejam contemplados os pescadores artesanais** nas ações do projeto.

O primeiro desafio, da resistência ao projeto, reside em duas características distintas encontradas em diversas comunidades. A primeira diz respeito a um perfil introspectivo da coletividade, onde a escala de qualquer ação parece desencorajar a participação pela falta de perspectiva dos grupos sociais diante das distintas pressões no território. São comunidades anestesiadas por mudanças avassaladoras no território, as quais, por se colocarem marginalizadas frente a esse processo, se consideram pequenas demais para qualquer enfrentamento. Nesse caso, a chegada de qualquer iniciativa lhes parece ou uma caridade inócua ou parte do mesmo processo que os marginaliza. Essa é uma situação evidenciada em duas realidades: comunidades ditas “isoladas”, de menor infraestrutura e dificuldade de acesso e; comunidades em processo de periferização, já imiscuídas em outras questões sociais que se sobressaem sobre a própria tradicionalidade.

A estratégia de mobilização nesses casos exige a desconstrução da desconfiança comunitária, em muito calcada no pessimismo, oferecendo exemplos que os identifiquem com outros grupos sociais que conseguiram reverter situações adversas e promover mudanças significativas na comunidade.

A segunda característica que gera resistência está no engajamento e organização de algumas comunidades, o que, por assimilarem uma postura crítica muito em função da experiência de luta, os faz assumir caráter questionador e de rejeição “à priori” das iniciativas nas comunidades, sobretudo das oriundas de grandes empresas ou órgãos ambientais.

Não raro tal situação se manifesta através de conflitos entre grupos políticos intracomunitários, que tendem a reivindicar questões próprias, por vezes alheias aos anseios coletivos. Tais questões têm amplo reflexo na participação.



Coordenador da Equipe



Técnico Responsável

1º Relatório Anual
PBS09RC20

Revisão 00
04/2018

Tal perfil merece uma abordagem específica que passa pelo profundo conhecimento das principais questões relacionadas às comunidades, buscando evitar ao máximo a simplificação dos temas. A estratégia de mobilização nesses casos reside em estabelecer um canal de diálogo e confiança através da escuta sensível e da construção da pauta comum a partir de um posicionamento junto aos pleitos dessas comunidades.

O segundo desafio integra parte da realidade que o projeto tem como objetivo reverter, que é o enfraquecimento das características tradicionais que qualificam o público prioritário. Como dito anteriormente, em comunidades onde, por inúmeras razões relacionadas à dinâmica do território, as questões sociais existentes ofuscam àquelas relacionadas à reprodução do modo de vida tradicional, é comum a perda da identidade prejudicando o autorreconhecimento. Tal fato se reflete nas gerações mais novas, já desvinculadas das práticas tradicionais, rompendo a característica de ancestralidade e transmissão de conhecimento oral e prático.

Nesse processo de pasteurização cultural, sobretudo em comunidades urbanas, torna-se um árduo trabalho angariar público prioritário tão específico e pulverizado em um complexo território.

Não há consenso, todavia, sobre qual a estratégia menos desgastante para garantir a adesão do público prioritário nas ações para esses casos. Já que o processo de mobilização, justamente para garantir que o público prioritário seja mobilizado, requer diálogo presencial e constante. Estratégia oportuna é iniciar a mobilização pelos pequenos territórios onde a prática vinculada a pesca artesanal é evidente: áreas de desembarque; ranchos; estaleiros, etc. Além de se apoiar em instituições representativas: colônias de pesca, associações, grupos organizados, etc.

Ainda assim, é frequente que nas atividades planejadas estejam presentes pessoas que não são o público prioritário do projeto. Neste contexto reside o terceiro desafio que é garantir que sejam atendidos os pescadores artesanais.

A estratégia adotada nas RR foi a de conduzir uma dinâmica denominada “gráfico humano” (com diferentes conduções metodológicas entre as equipes) que ilustra ao público presente quais são as atividades (e respectivos praticantes) que integram a cadeia produtiva da pesca. Neste momento fica caracterizado, mediante exposição dos objetivos do projeto, qual é o público prioritário do projeto. Exige-se da equipe executora atenção às falas para que sejam estimuladas apenas às questões relativas aos pescadores

artesanais. Esse tipo de postura da equipe executora, de garantir a fala do público prioritário, propiciou o surgimento de temas pertinentes à cadeia produtiva da pesca, mesmo quando consideradas atividades complementares.

Ressalta-se que tais questões não estão plenamente resolvidas e são parte de exercício constante de reflexão, tratadas na prática com a maior presença no território, ainda custosa ao dimensionamento da equipe.

III.2.3 Substituição da Orientação Pedagógica

No início da segunda etapa, houve a troca da orientadora pedagógica (OP). Ressalta-se que a decisão foi da empresa Mineral e não pesou a competência da profissional ou o alinhamento teórico-conceitual. A substituição foi motivada por questões de ambiência e gestão, onde verificou-se uma dificuldade em articulação com a coordenação e consequente gestão da equipe de campo, incorrendo em sobrecarga de demandas.

A nova OP procurou se inteirar sobre o caminho percorrido pelo Projeto até então, procurando identificar os avanços, limitações e desafios, bem como o olhar da equipe de campo sobre este processo. Também considerou a perspectiva da gestão do Projeto e das equipes que o acompanham e fiscalizam, Petrobras e IBAMA respectivamente.

III.2.4 Incremento Estrutural da Equipe de Campo

Conforme apresentado no item III.1.1 - Limitações do escopo de atuação e incremento da Equipe Executora, foi constatada necessidade de melhoria no projeto por meio do incremento da equipe, que está sendo viabilizado por meio de celebração de aditivo contratual.

IV MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO EDUCATIVO E RESULTADOS

O monitoramento e avaliação do processo educativo, de forma contínua e permanente, por meio de indicadores específicos, permite verificar a aproximação com os resultados propostos, além da correção de rumos, quando necessário, e aprimoramento das ações.

A proposta de Monitoramento e Avaliação do PEA Costa Verde foi inicialmente formulada tomando como base o Modelo de Avaliação de Projetos de Educação

Ambiental (em teste) para PEAs da Bacia de Campos (Critérios de Referência para Planejamento, Implementação, Monitoramento e Avaliação de Projetos de Educação Ambiental no Âmbito do Licenciamento Ambiental Federal de Petróleo e Gás), elaborado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), contratada pela empresa OGPAr para atendimento a uma condicionante de licença ambiental (Processo IBAMA 02022.001019/11).³

No entanto, considerando-se que este modelo ainda está em fase experimental e dada as peculiaridades do PEA Costa Verde, na Bacia de Santos, sentiu-se necessidade de construir indicadores mais específicos a esta realidade. Com o andamento do Projeto, sentiu-se a necessidade de um esforço coletivo da equipe de coordenação e de campo para a reconstrução de uma matriz, facilitando tanto a formação continuada da equipe executora, quanto o monitoramento e avaliação do Projeto pela coordenação. Assim, por meio da Carta UO-BS 0172/2018, protocolada em 20/03/2018, foi proposta a elaboração de uma matriz lógica de indicadores específica para o PEA Costa Verde, em substituição à proposta feita no Plano de Trabalho de utilização do Sistema de Monitoramento OGPAr/PUC (2016).

Ressalta-se que, durante a 3ª Oficina de Formação Continuada da Equipe Executora (OFCEE), iniciou-se um exercício coletivo com a intenção de revisar os objetivos do Projeto, definindo o que já foi feito e o que fazer (atividades) para cada um dos objetivos. Posteriormente, durante reunião de planejamento, foi possível avançar um pouco mais neste exercício, pensando em metas para as atividades. E, na 5ª OFCEE, a realizar-se em abril de 2018, prevê-se a finalização desse esforço para que, posteriormente, a equipe de coordenação possa trabalhar internamente na reconstrução de indicadores específicos. Por fim, esses indicadores serão validados e testados junto à equipe executora.

Apresentam-se abaixo alguns resultados alcançados pelo projeto em seu primeiro ano de implementação.

- ***Formação continuada da equipe executora***

Foram realizadas 4 oficinas de formação continuada da equipe executora, além de 1 oficina de preparação para o campo, totalizando 5 oficinas/ano. Nestas oficinas foram

³ OGPAr/PUC. Modelo de Avaliação de Projetos de Educação Ambiental em teste para PEAs da Bacia de Campos (Critérios de Referência para Planejamento, Implementação, Monitoramento e Avaliação de PEAs no Âmbito do Licenciamento Ambiental Federal de Petróleo e Gás. [S.l.]. 2016.

trabalhados diferentes conteúdos, dentre eles: organização comunitária, licenciamento ambiental de empreendimentos marítimos de petróleo e gás, gestão territorial e instrumentos de regularização fundiária, regularização e ordenamento pesqueiro, educação popular, royalties e participação social.

Percebe-se, pelos meios de verificação, que a equipe valorizou referenciais teóricos mais específicos do setor pesqueiro e do licenciamento ambiental de petróleo e gás em detrimento de materiais sobre educação popular, mobilização e participação social, incluindo aqueles indicados pela Orientadora Pedagógica e equipes de apoio (Petrobras). Sendo assim, a equipe de campo apresentou um avanço cognitivo para lidar com temas geradores que envolvem o território pesqueiro e o licenciamento ambiental. Por outro lado, apresentou limitações quanto à abordagem metodológica (linguagem, técnicas e ferramentas), carecendo ainda de formação e atuação prática com a educação popular.

○ ***Monitoramento e avaliação do processo educativo***

Em todas as intervenções socioeducativas realizadas, utilizaram-se meios de verificação que permitiram o acompanhamento do processo educativo, tais como: registros de campo, fichas de avaliação, registros fotográficos e outros. Durante o primeiro ciclo de ações formativas, a equipe de campo manifestou a necessidade de ajustes nas fichas de avaliação das atividades. Assim, um novo modelo de ficha de avaliação está passando por revisão final. Esta ficha contém itens mínimos em comum para toda a equipe, permitindo a sistematização dos dados. Porém, cada dupla de supervisor e técnico terá autonomia para incluir outros tópicos que julgue importante.

○ ***Retomada de relacionamento***

A retomada do relacionamento foi realizada, conforme pormenorizado no Relatório Descritivo e Analítico da Retomada, porém, limitações inerentes ao desenho do Projeto (p. ex. recurso financeiro, dimensionamento da equipe e passivos ambientais) prejudicaram a execução desse processo de retomada no tempo inicialmente previsto.

A equipe executora realizou visitas exploratórias e reuniões de retomada com quase todas as comunidades, consumando a devolutiva do diagnóstico participativo, incluindo atualização de dados importantes, e a apresentação do PEA para os comunitários. Também foi possível formar comissões comunitárias na grande maioria dos casos e

validar/priorizar temas geradores conforme a expectativa do público para iniciar o processo educativo.

○ ***Planejamento e execução das atividades formativas***

A equipe planejou, mobilizou os comunitários e realizou as atividades formativas em cerca de 90% das comunidades, conseguindo abordar o conteúdo mínimo esperado, bem como conteúdos específicos aos temas geradores. No entanto, passivos ambientais e limitações estruturais dificultaram a mobilização e realização das atividades em algumas comunidades.

V **TÉCNICOS RESPONSÁVEIS**

O **Quadro V-1** apresenta os autores do Relatório Anual do PEA Costa Verde, com os respectivos cargos, itens elaborados e Cadastros Técnicos Federais.

Quadro V-1 – Relação dos autores e respectivos itens elaborados para o Relatório Anual do PEA Costa Verde.


Responsável Técnico	Cargo	Itens Elaborados	Cadastro Técnico Federal
Guilherme H. B. Klaussner	Coordenador Geral	Todos os itens	Nº de registro: 3825218
Tatiana Matuk	Orientadora Pedagógica	Item IV	-
Júlia Cavalcante	Analista Ambiental	Sistematização das informações	-

ANEXOS




Coordenador da Equipe





Técnico Responsável

**1º Relatório Anual
PBS09RC20**

**Revisão 00
04/2018**




Coordenador da Equipe




Técnico Responsável

**1º Relatório Anual
PBS09RC20**


**Revisão 00
04/2018**

ANEXO I – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES DO PROJETO




Coordenador da Equipe





Técnico Responsável

**1º Relatório Anual
PBS09RC20**

**Revisão 00
04/2018**






Coordenador da Equipe





Técnico Responsável

**1º Relatório Anual
PBS09RC20**

**Revisão 00
04/2018**

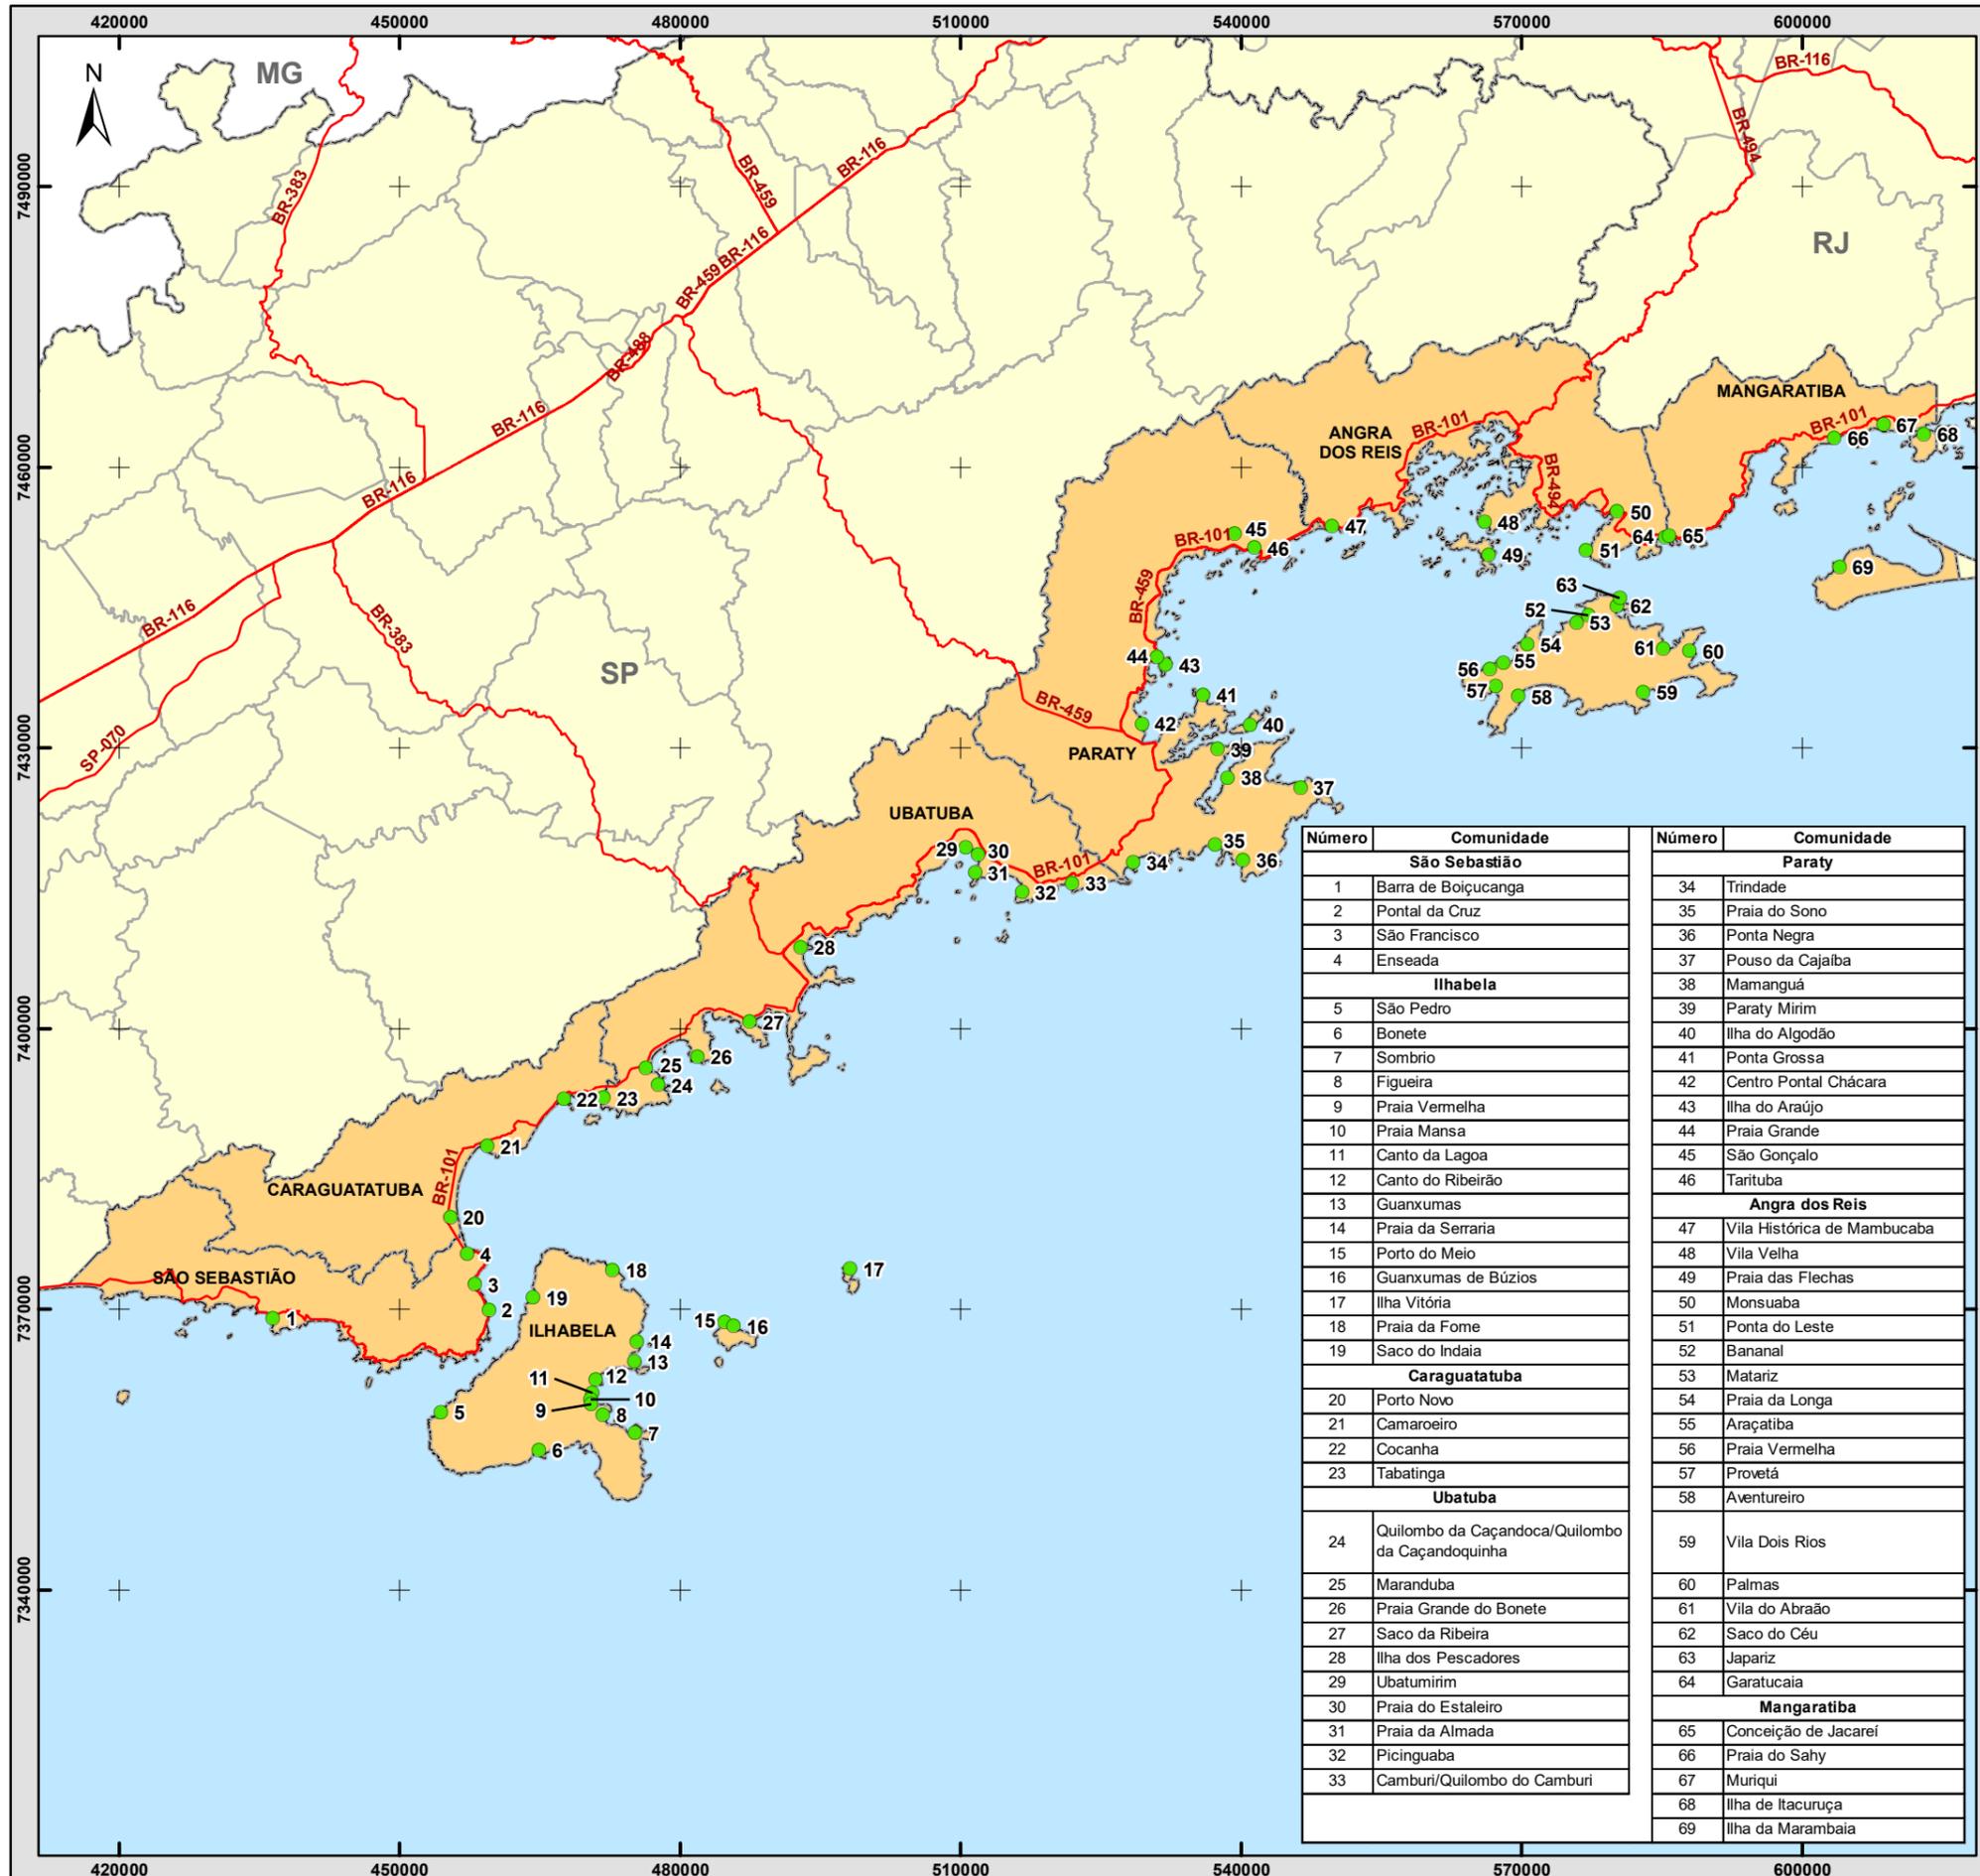

Número	Comunidade	Número	Comunidade
São Sebastião		Paraty	
1	Barra de Boiçucanga	34	Trindade
2	Pontal da Cruz	35	Praia do Sono
3	São Francisco	36	Ponta Negra
4	Enseada	37	Pouso da Cajaíba
Ilhabela		38	Mamanguá
5	São Pedro	39	Paraty Mirim
6	Bonete	40	Ilha do Algodão
7	Sombrio	41	Ponta Grossa
8	Figueira	42	Centro Pontal Chácara
9	Praia Vermelha	43	Ilha do Araújo
10	Praia Mansa	44	Praia Grande
11	Canto da Lagoa	45	São Gonçalo
12	Canto do Ribeirão	46	Tarituba
13	Guanxumas	Angra dos Reis	
14	Praia da Serraria	47	Vila Histórica de Mambucaba
15	Porto do Meio	48	Vila Velha
16	Guanxumas de Búzios	49	Praia das Flechas
17	Ilha Vitória	50	Monsuaba
18	Praia da Fome	51	Ponta do Leste
19	Saco do Indaia	52	Bananal
Caraguatatuba		53	Matariz
20	Porto Novo	54	Praia da Longa
21	Camareiro	55	Araçatiba
22	Cocanha	56	Praia Vermelha
23	Tabatinga	57	Provetá
Ubatuba		58	Aventureiro
24	Quilombo da Caçandoca/Quilombo da Caçandoquinha	59	Vila Dois Rios
25	Maranduba	60	Palmas
26	Praia Grande do Bonete	61	Vila do Abraão
27	Saco da Ribeira	62	Saco do Céu
28	Ilha dos Pescadores	63	Japariz
29	Ubatumirim	64	Garatucaia
30	Praia do Estaleiro	Mangaratiba	
31	Praia da Almada	65	Conceição de Jacareí
32	Picinguaba	66	Praia do Sahy
33	Camburi/Quilombo do Camburi	67	Muriqui
		68	Ilha de Itacuruça
		69	Ilha da Marambaia



DATUM: SIRGAS 2000 - Fuso 23K
PROJEÇÃO: UTM

REFERÊNCIAS UTILIZADAS:
- Limites Municipais (IBGE, 2010).
- Malha Viária (DNIT, 2015)




PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

1º RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PROJETO

LITORAL NORTE DE SÃO PAULO E SUL DO RIO DE JANEIRO
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES DO
PEA COSTA VERDE

ESCALA: 1:50.000 DATA: Março/2018
FIGURA Nº Anexo I FOLHA: 1/1 TAMANHO: A3
ELABORADO POR: João Felipe REV: 0




Coordenador da Equipe




Técnico Responsável

**1º Relatório Anual
PBS09RC20**


**Revisão 00
04/2018**

ANEXO II – CRONOLOGIA DOS EVENTOS DO PROJETO




Coordenador da Equipe





Técnico Responsável

**1º Relatório Anual
PBS09RC20**

**Revisão 00
04/2018**




Coordenador da Equipe




Técnico Responsável

**1º Relatório Anual
PBS09RC20**

**Revisão 00
04/2018**

Tipo de Evento	Local	Data	Início	Duração (em horas)	Objetivo do Evento	Metodologia Utilizada	Perfil dos condutores do evento	Nº de Particip.	Perfil dos Participantes
Oficina de Alinhamento Conceitual	Ubatuba Palace Hotel (Ubatuba)	08/11/2016	14:00	16:00	Apresentação do Projeto e Formação em Educação Popular	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	CG, OP, Petrobras	42	EE, AS, técnicos da Petrobras
Oficina de Preparação para o Campo	Associação Comercial (Caraguatatuba)	28/03/2017	09:00	12:00	Preparação da EE para atividades de campo	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	OP, CG, Ibama e Convidados	25	EE (Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba), técnicos da Petrobras
Oficina de Preparação para o Campo	Quilombo do Campinho (Paraty)	04/04/2017	09:00	12:00	Preparação da EE para atividades de campo	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	OP, CG, Ibama e Convidados	26	EE (Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba), técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Almada (Ubatuba)	16/05/2017	09:30	03:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	17	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Barra dos Pescadores (Ubatuba)	17/05/2017	18:30	03:30	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	12	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Porto Novo (Caraguatatuba)	19/05/2017	09:00	04:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	16	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	São Francisco (São Sebastião)	20/05/2017	09:00	03:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	9	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Camaroeiro (Caraguatatuba)	22/05/2017	14:00	02:30	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	12	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Tabatinga (Caraguatatuba)	23/05/2017	09:00	02:45	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	10	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Saco da Ribeira (Ubatuba)	24/05/2017	19:00	03:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	17	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Maranduba (Ubatuba)	29/05/2017	14:00	03:40	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	9	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Cocanha (Caraguatatuba)	31/05/2017	15:00	02:30	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	22	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras

Tipo de Evento	Local	Data	Início	Duração (em horas)	Objetivo do Evento	Metodologia Utilizada	Perfil dos condutores do evento	Nº de Particip.	Perfil dos Participantes
					Temas Geradores e formar comissões comunitárias.				
Reunião de Retomada	Cambury (Ubatuba)	02/06/2017	09:00	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	15	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Serraria (Ilhabela)	03/06/2017	14:00	02:30	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	17	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Caçandoca (Ubatuba)	03/06/2017	14:00	03:25	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	24	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Ponta Grossa (Paraty)	04/06/2017	10:40	01:30	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	7	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Praia do Sono (Paraty)	06/06/2017	18:00	03:30	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	24	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Picinguaba (Ubatuba)	07/06/2017	18:00	02:30	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	18	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Bonete (Ilhabela)	08/06/2017	16:00	03:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	38	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Estaleiro (Ubatuba)	09/06/2017	18:30	03:30	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	12	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Bonete (Ubatuba)	10/06/2017	09:00	03:30	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	13	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Monsuaba (Angra dos Reis)	12/06/2017	19:30	02:30	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	20	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras

Tipo de Evento	Local	Data	Início	Duração (em horas)	Objetivo do Evento	Metodologia Utilizada	Perfil dos condutores do evento	Nº de Particip.	Perfil dos Participantes
Reunião de Retomada	São Pedro (Ilhabela)	13/06/2017	18:00	03:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	10	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Vila Histórica de Mambucaba (Angra dos Reis)	13/06/2017	18:00	03:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	25	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	São Gonçalo (Paraty)	19/06/2017	17:00	03:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	26	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Canto da Lagoa (Ilhabela)	21/06/2017	13:00	04:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	12	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Ponta do Leste (Angra dos Reis)	21/06/2017	18:30	03:30	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	22	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Praia Mansa e Praia Vermelha (Ilhabela)	23/06/2017	10:00	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	9	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Praia da Figueira (Ilhabela)	24/06/2017	10:00	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	3	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Praia Grande (Paraty)	24/06/2017	17:00	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	3	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Saco do Céu (Angra dos Reis)	26/06/2017	18:00	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	12	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Praia Vermelha (Angra dos Reis)	27/06/2017	15:00	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	15	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Boiçucanga (São Sebastião)	28/06/2017	14:00	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	22	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras

Tipo de Evento	Local	Data	Início	Duração (em horas)	Objetivo do Evento	Metodologia Utilizada	Perfil dos condutores do evento	Nº de Particip.	Perfil dos Participantes
					Temas Geradores e formar comissões comunitárias.				
Reunião de Retomada	Araçatiba (Angra dos Reis)	28/06/2017	15:00	01:40	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	18	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Praia das Flechas (Angra dos Reis)	28/06/2017	18:00	03:45	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	15	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Vila Velha (Angra dos Reis)	30/06/2017	18:00	03:30	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	31	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Pontal da Cruz (São Sebastião)	01/07/2017	09:00	02:30	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	8	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Ilha da Marambaia (Mangaratiba)	01/07/2017	10:00	02:30	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	25	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Enseada (São Sebastião)	01/07/2017	14:00	02:30	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	8	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Trindade (Paraty)	03/07/2017	19:00	03:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	5	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Praia da Fome (Ilhabela)	05/07/2017	10:00	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	9	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Garatuaia (Angra dos Reis)	05/07/2017	17:00	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	3	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Vila Dois Rios (Angra dos Reis)	08/07/2017	13:00	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	14	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras

Tipo de Evento	Local	Data	Início	Duração (em horas)	Objetivo do Evento	Metodologia Utilizada	Perfil dos condutores do evento	Nº de Particip.	Perfil dos Participantes
Reunião de Retomada	Tarituba (Paraty)	08/07/2017	18:00	02:30	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	9	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Bananal (Angra dos Reis)	10/07/2017	18:00	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	28	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Ilha do Araújo (Paraty)	10/07/2017	18:00	03:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	7	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Matariz (Angra dos Reis)	12/07/2017	10:30	01:40	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	24	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Palmas (Angra dos Reis)	12/07/2017	17:00	02:10	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	14	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Paraty-Mirim (Paraty)	13/07/2017	15:00	03:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	15	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Ilha da Vitória (Ilhabela)	14/07/2017	09:00	03:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	12	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Praia do Sahy (Mangaratiba)	14/07/2017	09:30	02:20	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	24	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Centro/Pontal/Chácara (Paraty)	14/07/2017	17:30	02:30	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	9	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Vila do Abraão (Angra dos Reis)	14/07/2017	18:30	01:30	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	22	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Japariz (Angra dos Reis)	15/07/2017	08:30	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	16	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras

Tipo de Evento	Local	Data	Início	Duração (em horas)	Objetivo do Evento	Metodologia Utilizada	Perfil dos condutores do evento	Nº de Particip.	Perfil dos Participantes
					Temas Geradores e formar comissões comunitárias.				
Reunião de Retomada	Guanxumas de Búzios (Ilhabela)	15/07/2017	10:00	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	7	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Pouso da Cajaíba (Paraty)	15/07/2017	14:00	03:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	22	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Porto do Meio (Ilhabela)	16/07/2017	09:30	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	9	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Muriqui (Mangaratiba)	17/07/2017	09:30	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	28	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Ilha de Itacuruçá (Mangaratiba)	17/07/2017	16:00	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	12	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Conceição de Jacareí (Mangaratiba)	18/07/2017	18:00	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	11	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Provetá (Angra dos Reis)	20/07/2017	09:30	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	57	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Praia da Longa (Angra dos Reis)	20/07/2017	14:00	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	18	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Mangueira (Paraty)	20/07/2017	18:40	03:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	8	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Saco do Mamanguá (Paraty)	22/07/2017	10:00	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	7	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras

Tipo de Evento	Local	Data	Início	Duração (em horas)	Objetivo do Evento	Metodologia Utilizada	Perfil dos condutores do evento	Nº de Particip.	Perfil dos Participantes
Reunião de Retomada	Aventureiro (Angra dos Reis)	22/07/2017	17:00	02:10	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	31	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Ponta Negra (Paraty)	23/07/2017	14:00	02:30	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	13	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Canto do Ribeirão (Ilhabela)	24/07/2017	13:00	02:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	12	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião de Retomada	Saco do Sombrio (Ilhabela)	25/07/2017	10:00	04:00	Apresentar para comunidade resultados do DP, atualizar informações, validar e definir Temas Geradores e formar comissões comunitárias.	exposição dialogada; dinâmicas de grupo, roda de conversa	EE	9	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião com Comissão Comunitária	Maranduba (Ubatuba)	31/07/2017	15:00	01:45	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	3	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Camaroeiro (Caraguatatuba)	31/07/2017	10:00	01:30	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	3	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Pontal da Cruz (São Sebastião)	01/08/2017	09:30	02:00	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	4	EE e Membros das Comissões Comunitárias
1ª Oficina de Formação da EE	Sede do Núcleo Picinguaba (Ubatuba)	08/08/2017	09:00	16:00	Preparação da EE para Ações Formativas	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	OP; CG e Especialista convidado	46	EE; AS, Petrobras
Reunião com Comissão Comunitária	Enseada (São Sebastião)	12/08/2017	10:30	01:00	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	3	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Boiçucanga (São Sebastião)	12/08/2017	n.i.	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE		EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Cocanha (Caraguatatuba)	12/08/2017	10:30	01:00	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	4	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Trindade (Paraty)	15/08/2017	n.i.	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	10	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Tabatinga (Caraguatatuba)	16/08/2017	10:30	01:30	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	5	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Saco da Ribeira (Ubatuba)	16/08/2017	16:30	01:00	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	4	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Estaleiro (Ubatuba)	18/08/2017	18:30	02:00	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	9	EE e Membros das Comissões Comunitárias

Tipo de Evento	Local	Data	Início	Duração (em horas)	Objetivo do Evento	Metodologia Utilizada	Perfil dos condutores do evento	Nº de Particip.	Perfil dos Participantes
Reunião com Comissão Comunitária	Porto Novo (Caraguatatuba)	18/08/2017	09:30	02:00	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	10	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	São Gonçalo (Paraty)	21/08/2017	n.i.	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	10	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Tarituba (Paraty)	21/08/2017	15:30	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	5	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Bananal (Angra dos Reis)	22/08/2017	18:00	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	9	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Matariz (Angra dos Reis)	23/08/2017	18:30	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	4	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Saco do Mamanguá (Paraty)	24/08/2017	n.i.	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	20	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Paraty-Mirim (Paraty)	24/08/2017	n.i.	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	4	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Bonete (Ubatuba)	26/08/2017	09:30	02:00	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	10	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Caçandoca (Ubatuba)	26/08/2017	15:30	02:30	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	9	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	São Pedro (Ilhabela)	28/08/2017	17:30	02:30	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	4	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Muriqui (Mangaratiba)	28/08/2017	10:00	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	9	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Camburi (Ubatuba)	29/08/2017	10:00	01:30	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	6	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Praia do Sono (Paraty)	29/08/2017	n.i.	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	3	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Conceição de Jacareí (Mangaratiba)	29/08/2017	18:00	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	4	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Praia do Sahy (Mangaratiba)	29/08/2017	10:00	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	11	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Picinguaba (Ubatuba)	30/08/2017	18:00	02:00	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	3	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Saco do Céu (Angra dos Reis)	30/08/2017	18:00	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	6	EE e Membros das Comissões Comunitárias

Tipo de Evento	Local	Data	Início	Duração (em horas)	Objetivo do Evento	Metodologia Utilizada	Perfil dos condutores do evento	Nº de Particip.	Perfil dos Participantes
Reunião com Comissão Comunitária	Vila Velha (Angra dos Reis)	31/08/2017	n.i.	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	7	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Aventureiro (Angra dos Reis)	31/08/2017	17:00	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	9	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Provetá (Angra dos Reis)	31/08/2017	10:00	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	4	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Ilha da Vitória (Ilhabela)	01/09/2017	11:50	02:00	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	3	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Monsuaba (Angra dos Reis)	01/09/2017	14:00	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	3	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Ponta do Leste (Angra dos Reis)	01/09/2017	10:30	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	3	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Ubatumirim (Ubatuba)	02/09/2017	09:30	02:00	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	9	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Vila Dois Rios (Angra dos Reis)	02/09/2017	13:30	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	4	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Ponta Negra (Paraty)	04/09/2017	n.i.	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	5	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Palmas (Angra dos Reis)	04/09/2017	18:30	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	4	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Serraria (Ilhabela)	05/09/2017	11:15	02:15	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	8	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Praia da Fome (Ilhabela)	05/09/2017	15:30	02:00	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	4	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Vila do Abraão (Angra dos Reis)	05/09/2017	17:00	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	6	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Praia da Longa (Angra dos Reis)	11/09/2017	16:00	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	6	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Araçatiba (Angra dos Reis)	12/09/2017	16:00	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	3	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Praia Vermelha (Angra dos Reis)	12/09/2017	16:00	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	4	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Bonete (Ilhabela)	13/09/2017	16:30	02:00	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	4	EE e Membros das Comissões Comunitárias

Tipo de Evento	Local	Data	Início	Duração (em horas)	Objetivo do Evento	Metodologia Utilizada	Perfil dos condutores do evento	Nº de Particip.	Perfil dos Participantes
Reunião com Comissão Comunitária	Ponta Grossa (Paraty)	13/09/2017	n.i.	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	2	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Ilha de Itacuruçá (Mangaratiba)	14/09/2017	14:00	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	4	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Canto do Ribeirão (Ilhabela)	15/09/2017	11:40	01:20	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	7	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Praia Mansa e Praia Vermelha (Ilhabela)	15/09/2017	15:20	01:40	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	4	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Praia das Flechas (Angra dos Reis)	15/09/2017	14:00	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	8	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Canto da Lagoa (Ilhabela)	16/09/2017	09:30	01:50	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	5	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Praia da Figueira (Ilhabela)	16/09/2017	12:15	01:45	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	4	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Japariz (Angra dos Reis)	16/09/2017	09:30	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	6	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Ilha da Marambaia (Mangaratiba)	18/09/2017	10:30	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	8	EE e Membros das Comissões Comunitárias
2ª Oficina de Formação da EE	Associação Dos Servidores Público (Angra dos Reis)	19/09/2017	09:00	09:00	Preparação da EE para Ações Formativas	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	OP e Especialistas convidados	41	EE, AS, Petrobras
Reunião com Comissão Comunitária	Praia Grande (Paraty)	22/09/2017	n.i.	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	6	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Guanxumas de Búzios (Ilhabela)	23/09/2017	11:50	01:40	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	3	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Porto do Meio (Ilhabela)	23/09/2017	15:00	02:00	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	7	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Ilha do Araújo (Paraty)	23/09/2017	n.i.	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	3	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Barra dos Pescadores (Ubatuba)	25/09/2017	19:00	02:00	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	3	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Saco do Sombrio (Ilhabela)	28/09/2017	11:45	02:00	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	8	EE e Membros das Comissões Comunitárias
Reunião com Comissão Comunitária	Centro/Pontal/Chácara (Paraty)	05/10/2017	19:40	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	4	EE e Membros das Comissões Comunitárias

Tipo de Evento	Local	Data	Início	Duração (em horas)	Objetivo do Evento	Metodologia Utilizada	Perfil dos condutores do evento	Nº de Particip.	Perfil dos Participantes
Ação Formativa	Tabatinga (Caraguatatuba)	06/10/2017	09:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	11	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Enseada (São Sebastião)	07/10/2017	09:00	04:00	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	13	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Camaroeiro (Caraguatatuba)	09/10/2017	09:00	04:00	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	21	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Saco da Ribeira (Ubatuba)	10/10/2017			Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	2	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Boiçucanga (São Sebastião)	18/10/2017	14:00	04:00	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	16	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Saco do Mamangá (Paraty)	21/10/2017	09:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	27	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Caçandoca (Ubatuba)	21/10/2017	14:00	04:00	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	15	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Vila Velha (Angra dos Reis)	23/10/2017	18:30	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	16	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Canto da Lagoa (Ilhabela)	23/10/2017	14:00	02:00	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	7	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Bananal (Angra dos Reis)	24/10/2017	18:30	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	30	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Almada (Ubatuba)	24/10/2017	18:00	04:00	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	16	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Bonete (Ilhabela)	26/10/2017	16:00	04:00	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	11	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Serraria (Ilhabela)	28/10/2017	13:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	15	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Cocanha (Caraguatatuba)	28/10/2017	14:30	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	10	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	São Gonçalo (Paraty)	30/10/2017	18:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	23	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Praia do Sahy (Mangaratiba)	30/10/2017	10:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	23	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Maranduba (Ubatuba)	30/10/2017	14:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	7	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras

Tipo de Evento	Local	Data	Início	Duração (em horas)	Objetivo do Evento	Metodologia Utilizada	Perfil dos condutores do evento	Nº de Particip.	Perfil dos Participantes
Ação Formativa	Barra dos Pescadores (Ubatuba)	31/10/2017	19:30	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	6	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Muriqui (Mangaratiba)	31/10/2017	10:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	20	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Saco do Céu (Angra dos Reis)	06/11/2017	18:50	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	15	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Saco do Sombrio (Ilhabela)	07/11/2017	11:00	04:00	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	9	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Matariz (Angra dos Reis)	07/11/2017	18:40	02:50	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	14	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Praia das Flechas (Angra dos Reis)	08/11/2017	15:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	14	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Estaleiro (Ubatuba)	08/11/2017	18:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	8	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Canto do Ribeirão (Ilhabela)	08/11/2017	11:00	04:00	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	10	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Provetá (Angra dos Reis)	09/11/2017	15:30	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	15	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Ponta do Leste (Angra dos Reis)	10/11/2017	18:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	5	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Ubatumirim (Ubatuba)	11/11/2017	09:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	10	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Vila Dois Rios (Angra dos Reis)	11/11/2017	13:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	12	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Monsuaba (Angra dos Reis)	13/11/2017	18:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	15	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Ilha do Araújo (Paraty)	13/11/2017	18:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	10	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Praia da Longa (Angra dos Reis)	14/11/2017	16:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	13	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Guanxumas de Búzios (Ilhabela)	16/11/2017	12:30	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	9	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Centro/Pontal/Chácara (Paraty)	16/11/2017	18:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	2	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras


Tipo de Evento	Local	Data	Início	Duração (em horas)	Objetivo do Evento	Metodologia Utilizada	Perfil dos condutores do evento	Nº de Particip.	Perfil dos Participantes
Ação Formativa	Porto Novo (Caraguatatuba)	17/11/2017	09:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	13	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Praia da Figueira (Ilhabela)	18/11/2017	11:00	04:00	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	8	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Praia da Fome (Ilhabela)	21/11/2017	10:00	04:00	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	9	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Praia Mansa e Praia Vermelha (Ilhabela)	23/11/2017	14:00	02:00	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	13	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	São Pedro (Ilhabela)	27/11/2017	14:00	02:00	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	15	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Garatuaia (Angra dos Reis)	27/11/2017	15:30	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	27	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Palmas (Angra dos Reis)	28/11/2017	18:45	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	15	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Picinguaba (Ubatuba)	29/11/2017	18:30	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	21	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Pontal da Cruz (São Sebastião)	30/11/2017	18:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	10	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Bonete (Ubatuba)	01/12/2017	09:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	7	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Araçatiba (Angra dos Reis)	02/12/2017	15:50	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	10	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Ponta Negra (Paraty)	02/12/2017	09:40	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	9	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Vila do Abraão (Angra dos Reis)	05/12/2017	16:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	26	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Cambury (Ubatuba)	05/12/2017	13:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	12	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Japariz (Angra dos Reis)	08/12/2017	18:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	13	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Porto do Meio (Ilhabela)	09/12/2017	13:00	04:00	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	11	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Pouso da Cajaíba (Paraty)	09/12/2017	09:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	19	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras

Tipo de Evento	Local	Data	Início	Duração (em horas)	Objetivo do Evento	Metodologia Utilizada	Perfil dos condutores do evento	Nº de Particip.	Perfil dos Participantes
Ação Formativa	Aventureiro (Angra dos Reis)	10/12/2017	14:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	25	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Vila Histórica de Mambucaba (Angra dos Reis)	11/12/2017	18:30	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	13	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Praia Vermelha (Angra dos Reis)	12/12/2017	19:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	15	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Ilha de Itacuruçá (Mangaratiba)	13/12/2017	14:30	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	40	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Reunião com Comissão Comunitária	Paraty-Mirim (Paraty)	13/12/2017	n.i.	n.i.	Reunir comissão e construir atividade formativa	roda de conversa	EE	6	EE; AS; Comunitários,
Ação Formativa	Ilha de Vitória	15/12/2017	13:45	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	8	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Praia Grande (Paraty)	15/12/2017	18:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	8	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Saco do Indaiá e Praia de Guanxumas (Ilhabela)	16/12/2017	10:15	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	10	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
Ação Formativa	Tarituba (Paraty)	18/12/2017	18:00	02:30	Trabalhar Tema Gerador	exposição dialogada; dinâmicas de grupo	EE	11	EE; AS; Comunitários, técnicos da Petrobras
3ª Oficina de Formação da EE	Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Picinguaba (Ubatuba)	18/12/2017	09:00	08:00	Planejamento e Formação em Educação Popular	exposição dialogada; estudo de caso; painel integrado	OP; CG e Especialista convidado	23	EE, técnicos da Petrobras
4ª Oficina de Formação da EE - SP	Associação Comercial (Caraguatatuba)	21/02/2018	09:00	08:00	Preparação da EE para Ações Formativas	exposição dialogada; estudo de caso; dinâmicas em grupo	OP; Especialista convidado	30	EE, AS, Petrobras, Ibama
4ª Oficina de Formação da EE - RJ	Sede da ESCE Tamoios (Paraty)	23/02/2018	09:00	08:00	Preparação da EE para Ações Formativas	exposição dialogada; estudo de caso; dinâmicas em grupo	OP; Especialista convidado	21	EE, AS, Petrobras, Ibama

Legenda: EE - Equipe Executora; AS - Agente Social; CG - Coordenador Geral; OP - Orientadora Pedagógica; n.i. - não informado

ANEXO III – QUADRO DE INSTITUIÇÕES CONTATADAS




Coordenador da Equipe




Técnico Responsável


1º Relatório Anual
PBS09RC20

Revisão 00
04/2018




Coordenador da Equipe




Técnico Responsável

**1º Relatório Anual
PBS09RC20**

**Revisão 00
04/2018**

O quadro abaixo detalha quais as instituições contatadas durante o período das visitas exploratórias em todas as localidades:

Quadro Anexo 3 – Instituições contatadas durante as visitas exploratórias.

Associações Comunitárias	
	Associação de Moradores e Pescadores do bairro São Pedro
	Associação Amor Castelhanos
	Associação de Pescadores da Tabatinga
	Associação dos Pescadores da Praia do Camaroeiro
	Associação de Moradores e Amigos do Camburi (AMAC)
	Associação dos Remanescentes do Quilombo do Camburi (ARQC)
	Associação de Moradores da Picinguaba
	Associação de Barqueiros da Picinguaba
	Associação de Moradores da Almada
	Associação Cultural e Esportiva dos Caiçaras da Praia do Estaleiro – ACECAPRE
	Associação de Moradores do Saco da Ribeira;
	Associação de Pescadores do Saco da Ribeira
	Associação dos Remanescentes do Quilombo da Caçandoca
	Associação dos Pescadores da Maranduba
	Associação dos Barqueiros de Trindade (ABAT)
	Associação de Moradores de Trindade (AMOT)
39	Associação de Moradores Originários do Sono
	Associação de Moradores da Ponta Negra
	Associação de Moradores de Paraty-Mirim.
	Associação de Moradores do Pouso da Cajaíba
	Associação de Moradores da Ponta Grossa
	Associação de Moradores da Ilha da Cobras
	Moradores de Mangueira
	Associação de Moradores da Praia Grande
	Associação de Artesãs Caiçaras
	Associação de Moradores de São Gonçalo
	Associação de Moradores de Tarituba
	Associação Cultural de Tarituba
	Associação dos Pescadores Artesanais da Praia Vermelha
	Associação de Moradores de Vila Velha
	Associação de Moradores da Ilha da Gipóia
	Associação de Moradores da Monsuaba
	Associação de Moradores do Saco do Céu
	Associação de Moradores de Matariz


	Associação de Pousadas da Enseada do Bananal (APEB)
	Associação de Moradores da Enseada do Bananal.
	Associação de Moradores da Enseada de Araçatiba
	Associação de Moradores do Abraão (AMA)
	Associação de Moradores de Palmas-AMEP
Colônias de Pesca	
4	Colônia de Pesca Z6 de Ilhabela
	Colônia de Pesca Z14 de São Sebastião
	Colônia Z10 Ubatuba
	Colônia de Pesca Z18 de Paraty
Cooperativas	
2	Cooperativa de Pesca de São Sebastião (Ilhabela)
	Cooperativa de Pesca de São Sebastião (COOPERPESCASS)
Instituições Municipais	
6	Prefeitura de Ilhabela
	Secretaria de Desenvolvimento Social de Ilhabela
	Prefeitura Municipal de Ilhabela com o projeto de Juçara
	Prefeitura de Paraty
	Secretaria de Agricultura e Pesca de Paraty
	Comitê das Comunidades Tradicionais do 2º Distrito de Paraty
Instituições de Ensino e Pesquisa	
7	EM Professora Maria Thereza de Freitas Vidal
	E. M. Sylvestre Travassos
	UERJ- CEADS
	Ecomuseu de Ilha Grande
	Colégio Estadual Pedro Soares
	Escola Municipal Pedro Soares.
	E.M Ayrton Senna da Silva.
Instituições Particulares	
1	Yatch Clube de Ilhabela – Saco do Sombrio
Instituições do Terceiro setor	
8	OSCIP Ambiental Litoral Norte
	Associação e Instituto Bonete Sempre
	Projeto Terra do Guaiamum
	IPECA (Instituto de Permacultura e Educação Caiçara)
	ITAE (Instituto Trilha da Arte e Educação)
	ONG As Vermelhas
	Observatório dos Territórios Saudáveis e Sustentáveis da Bocaina - OTSS
	Fórum de Comunidades Tradicionais de Ubatuba, Paraty e Angra dos Reis
Unidades de Conservação e Instituições de Gestão Ambiental	

	Parque Estadual da Serra do Mar
	Fundação Florestal do Estado de São Paulo
	APA Marinha do Litoral Norte
	Parque Estadual da Ilhabela
9	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
	Parque Estadual da Ilha Grande
	APA Tamoios
	Parque Nacional da Bocaina
	APA Caiuru
76	Total




Coordenador da Equipe





Técnico Responsável

**1º Relatório Anual
PBS09RC20**

**Revisão 00
04/2018**

ANEXO IV - COMUNIDADES QUE NÃO PARTICIPARAM DAS AÇÕES
FORMATIVAS




Coordenador da Equipe




Técnico Responsável


1º Relatório Anual
PBS09RC20

Revisão 00
04/2018




Coordenador da Equipe




Técnico Responsável

**1º Relatório Anual
PBS09RC20**

**Revisão 00
04/2018**

UBATUBA

- Bonete

A comunidade da Praia Grande do Bonete é de difícil acesso, sendo possível acessar a comunidade por barco ou trilha. Muitos dos moradores tradicionais não residem mais na comunidade durante a semana em virtude dessa dificuldade.

O dia agendado para a AF na comunidade (1 de dezembro de 2017, às 9:00h) amanheceu com bastante chuva, dificultando ainda mais o acesso. A reunião já havia sido alterada duas vezes por conta de solicitação dos comunitários (outros compromissos no dia reservado). Acredita-se que por conta desses fatores, apenas quatro comunitárias compareceram ao encontro.

Após conversa com a equipe as comunitárias avaliaram melhor combinar nova data no próximo ano, pois acreditam que é uma conversa que deve ter maior presença de moradores. Disseram ainda que é importante mobilizar moradores que tem problemas mais sérios com Saneamento – tema prioritário da comunidade.

Em função da importância do tema, que envolve não somente os moradores, foi decidido inicialmente que a ação formativa deveria incluir a participação de veranistas, mais como forma de sensibilização do que de formação. Porém, posteriormente, foi conversado que seria importante primeiro realizar a AF com os moradores tradicionais e depois com os veranistas.

Por fim, com relação à mobilização foi destacada a importância da equipe de campo estar mais presente na comunidade para melhor entendimento da situação do saneamento e então realizar uma mobilização mais efetiva.

Encaminhamentos:

- Combinar nova data em 2018 para AF com o tema prioritário “Saneamento Básico – tratamento alternativos de esgoto doméstico” e “Etapa 3 - Licenciamento de grandes empreendimentos de petróleo e gás”.
- Elaborar painel fixo para divulgar as ações e os encaminhamentos do PEA

- Barra dos Pescadores

A AF não aconteceu por falta de quórum. Apenas foi possível fazer alguns encaminhamentos a respeito da necessidade de desassorear a barra do rio Grande de Ubatuba.

A reunião estava marcada para começar às 18h no CATI e até às 19h30m apenas dois comunitários haviam chegado. Os presentes avaliaram que seria melhor combinar uma nova data para a realização da AF. Logo após, mais dois comunitários chegaram e foi possível estabelecer alguns encaminhamentos com relação à dragagem do Rio, que foi o tema de interesse dos presentes.

O comunitário Marcelo, que é parte da diretoria da colônia Z-10, há algum tempo acompanha esse processo e pôde trazer esclarecimentos importantes do processo realizado até o momento e, a partir dessas informações, foi possível combinar alguns encaminhamentos com relação a esse tema.

Encaminhamentos

- Conversa com o Comitê de Bacias Hidrográficas do litoral Norte – CBH/LN e com o Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE para averiguar como funciona o licenciamento parcial/emergencial de dragagem (PEA e Marcelo);
- Imagem do *Google earth* ou foto da Barra do Rio com a maré baixa para evidenciar a necessidade de executar a dragagem (Marcelo / Comissão).

PARATY

- Centro/Pontal/Chácara e Mangueira

No dia 16 de novembro de 2017, AF pretendida sobre fiscalização da pesca a ser realizada conjuntamente para as comunidades Centro/Pontal/Chácara e Mangueira não foi realizada por falta de quórum, uma vez que apenas um pescador da comunidade da Chácara e o presidente da Associação de Moradores da Mangueira compareceram, mesmo após ampla mobilização (dias 12 e 16 de novembro de 2017).

A reunião tinha como objetivo compreender as ações de fiscalização no território pesqueiro de Paraty de forma integrada a partir do ponto de vista do IBAMA, APA Marinha Municipal da Baía de Paraty e ESEC Tamoios. Portanto, haviam sido convidados o chefe do IBAMA - Unidade Técnica de 2º Nível em Angra dos Reis, Luis Felipe Bonifácio da Silva, assim como a gestora da APA Marinha Municipal de Paraty, Mônica Nemer e o gestor da ESEC Tamoios (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio), Fernando Brutto.

As comunidades da Chácara e Pontal, assim como outras comunidades inseridas no contexto urbano e rural de Paraty, município relativamente pequeno (aproximadamente 40 mil habitantes), por vezes estão submetidas às relações de apadrinhamento e clientelismo com o poder público local, o que dificulta as ações do PEA voltadas a cobranças de direitos por políticas públicas de instituições como Prefeitura e até mesmo a Colônia de Pescadores. Isto ficou bastante evidente quando um dos membros da comissão, que possui um cargo na Colônia de Pescadores Z-18, manifestou por vezes que a equipe do PEA “não precisa se preocupar com esses assuntos, pois a Colônia já estava resolvendo”. A equipe de campo do PEA presume que houve iniciativas por parte dessas pessoas ligadas ao poder público local para a desmobilização e esvaziamento dos espaços propostos pelo projeto.

- Paraty-Mirim

Para dar encaminhamento as propostas feitas pela comissão para o tema prioritário da comunidade “Regularização fundiária (incluindo área da praia para construção de ranchos)”, no dia 10 de outubro de 2017 foi realizado contato telefônico com Édél Pádua Corrêa Júnior, Secretário Adjunto de Habitação e Regularização Fundiária do município de Paraty (SEHAB). Nesta oportunidade, este secretário comunicou quais ações já haviam sido realizadas até então: ofício foi entregue pelas Associações de Moradores do 2º Distrito de Paraty em junho de 2015 solicitando a entrada no Programa de Regularização Fundiária junto ao Instituto de Terras do Rio de Janeiro - ITERJ; em agosto do mesmo ano, um Termo de Cooperação Técnica (TCT) foi assinado entre Secretaria Estadual de Habitação - SEHAB, ITERJ, Secretaria Municipal de Habitação e comunidades do 2º distrito; ainda em 2015 houve uma visita técnica a Paraty-Mirim para identificação das áreas; reuniões com a comunidade para entrega do TCT e sua publicação no Diário Oficial da União; Assembleia do ITERJ em Paraty para tratar dos procedimentos para Regularização Fundiária; repasses da SEHAB para comunidade. Comunicou também que o processo estava parado, mas que a comunidade estava esclarecida do que havia sido feito até o momento (inclusive com cópia de todos os documentos do processo), não havendo necessidade de que isso fosse feito através de uma Ação Formativa. No dia 11 de outubro, este secretário disponibilizou por e-mail todos os documentos do processo de regularização fundiária de Paraty-Mirim para a equipe do PEA.

Junto a isso, no final de setembro a equipe do PEA foi abordada pelo presidente do Conselho das Associações da População e Povos Tradicionais do Segundo Distrito de Paraty - CONAP Tradicional, que informou que em conversa interna com a comissão preferiam mudar o tema, uma vez que não enxergavam chances de avanço na temática da regularização fundiária. Sinalizou que era prioritário trabalhar com o tema do assoreamento do rio, que provocava constantes alagamentos na comunidade.

No dia 07 de dezembro de 2017 foi realizada a segunda reunião com a comissão de Paraty-Mirim, com a presença de 5 comunitários. A equipe do PEA fez uma fala para relembrar os acontecimentos até aquele momento e informou que a mudança de tema deveria ser algo acordado numa nova reunião ampliada, na qual a comunidade pudesse entrar em acordo sobre as novas modificações. A comissão mostrou que já possui um projeto para evitar o alagamento da estrada, mas salientou a dificuldade em dar encaminhamento ao tema devido aos desentendimentos entre os órgãos responsáveis. A equipe do PEA se prontificou a ajudá-los a redigir um ofício chamando os órgãos implicados no desassoreamento do rio para uma conversa conjunta. O presidente do CONAP Tradicional se responsabilizou em juntar os documentos que comporiam a base desse ofício.

Ficou acordado também que a Associação de Moradores iria chamar uma reunião ampliada para tratar da mudança do tema, que depois seria repassada para equipe do PEA.

No dia 13 de dezembro de 2017 a equipe do PEA foi a Paraty-Mirim para orientar a produção do ofício, conforme combinado anteriormente. Uma apresentação foi preparada, com uma dinâmica para compreender como se construir um ofício. Embora a comissão tenha confirmado seu interesse e participação, não houve quórum para esta atividade.

- Trindade

Para dar encaminhamento para AF de Trindade, no dia 22 de setembro de 2017 foi realizado o primeiro contato via e-mail com Viviane Lasmar, gestora da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo - RESEX Marinha de Arraial do Cabo (ICMBio), sobre seu interesse e disponibilidade em ir a Trindade, a convite do PEA, para falar sobre a RESEX como estratégia para garantia dos territórios pesqueiros. No mesmo dia a gestora já sinalizou positivamente a este e-mail.

Posteriormente, já na organização para sua vinda, em conversa com alguns outros funcionários do ICMBio, foi advertido que não era um bom momento político para tratar de RESEX junto à comunidade através do ICMBio, pois havia um cenário delicado com a recém mudança de gestão do Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB), Unidade de Conservação que sobrepõe à comunidade de Trindade inclusive no território marítimo, mudanças recentes também na Coordenação Regional 8 (CR8) do ICMBio (que abrange o estado do Rio de Janeiro) e também com a revisão do Plano de Manejo da APA Cairuçu (que também se sobrepõe a comunidade da Trindade) que está em curso. Dessa forma, foi enviado um e-mail de desmobilização da gestora da RESEX de Arraial do Cabo.

No dia 17 de novembro de 2017, foi realizado contato com duas lideranças de Trindade para explicar a situação e propor mudança de estratégia, que responderam que independente da mudança de estratégia proposta, já não seria mais possível fazer qualquer reunião na Trindade no ano de 2017, pois todos já estavam envolvidos com a preparação da alta temporada turística. Por fim, no dia 13 de dezembro foi realizada uma nova visita a Trindade para confirmar, junto às lideranças, o interesse na manutenção do assunto RESEX Marinha e a impossibilidade de realização da Ação formativa neste ano. Como encaminhamento desta visita, ficou decidida a realização de uma nova reunião ampliada da comissão para estudar novas estratégias para tratar o assunto RESEX Marinha para AF após o carnaval de 2018.

- Praia do Sono

Durante algum tempo a equipe de campo do PEA planejou a AF da comunidade da Praia do Sono como algo que deveria ser feito em uma reunião longa, ou em uma sequência contínua de reuniões, já que se trataria principalmente de se trabalhar com técnicas de consenso em um fórum ampliado de discussão. Mas, para que este fórum para construção de um regimento fosse realmente legítimo, isto é, produzissem regras que realmente fossem cumpridas, era preciso que a comunidade como um todo considerasse o regimento importante e não somente os que participaram da Reunião de Retomada.

Assim, no dia 14 de novembro de 2017, a equipe foi a campo realizar conversas individuais para validar a proposta de AF, com um enfoque inicial nas regras para ordenamento turístico. Durante estas conversas, praticamente todas as pessoas demonstraram interesse no tema e ratificaram sua importância, porém foram observados dois aspectos importantes: (1) não seria possível realizar uma AF com mais de 3 horas,

como se acreditava ser necessário; (2) trabalhar com a diversidade de opiniões sobre cada tema a fim de consolidar uma regra, tendo pouco tempo disponível para formar acordos, poderia ser mais prejudicial ao processo, pois os conflitos seriam acentuados, uma vez que não há homogeneidade de opiniões e estão estabelecidas relações de poder.

Dessa forma, foi elaborada uma nova estratégia para que o processo conferisse oportunidade de voz a todas as pessoas e tivesse um caráter realmente pedagógico. Os temas sobre ordenamento do turismo considerados mais polêmicos, a partir da fala da própria comunidade, seriam elaborados e aplicados através de entrevistas semiestruturadas (anônimas). Assim, as diversas opiniões poderiam ser agrupadas por blocos temáticos e sistematizadas para facilitar as discussões e decisões. Para validar esta nova estratégia, buscou-se novamente 4 lideranças da comunidade, que aprovaram o novo método de trabalho.

Isto posto, a equipe de campo passou a elaborar o questionário para sua aplicação no ano seguinte (2018), tendo em vista que este será o início de um longo processo para elaboração de regras para o turismo.

- Produção do questionário:

Os temas polêmicos relacionados ao turismo, coletados a partir das falas dos moradores, foram listados s seguir:

- Caminhos de servidão como garantia de acesso a praia;
- Estrutura dos campings (fossa, lixeiras, etc.);
- Preço dos campings (mínimo);
- Limite de barracas;
- Barracas dispostas nos lugares de passagem (limite dos campings);
- Venda de produtos por pessoas de fora da comunidade;
- Turistas que trazem bebidas;
- Arrendamento (aluguel dos estabelecimentos comerciais) para pessoas de fora;
- Lixo;
- Fogueiras;
- Como fiscalizar quem não cumpre as regras;

A partir destes assuntos a equipe técnica elaborou um questionário.

- Ponta Grossa

Ao longo dos meses, a equipe de campo do PEA tentou organizar por telefone a AF junto à comissão. As conversas eram sempre bastante confusas e sem que se chegasse

a conclusões sobre ações que fossem de interesse e que pudessem contribuir com a organização da comunidade.

A equipe identificou a dificuldade de a comissão compreender os objetivos e os limites do PEA. Dessa forma, no dia 18 de dezembro, a equipe do PEA se reuniu novamente com a comunitária, membro da comissão da Ponta Grossa, a fim de tentar, mais uma vez, esclarecer o projeto e acordar a ação deixada para ser realizada no ano seguinte (2018). A comunitária reforçou que os problemas da comunidade continuam sendo a falta de habilitações para pilotar as embarcações, o saneamento e a captação de água. A moradora se mostrou bastante cansada em esperar pelo poder público cumprir com suas obrigações legais e solicitou que o PEA trouxesse para a AF informações sobre alternativas para o tratamento de esgoto.

MANGARATIBA

- Ilha da Marambaia

A Ação Formativa na comunidade Ilha da Marambaia, no município de Mangaratiba – RJ, agendada para o dia 9 de dezembro, precisou ser cancelada um dia antes do encontro.

O cancelamento ocorreu devido a diversos motivos: condições marítimas que poderiam colocar a equipe executora em risco; impossibilidade do convidado Vagner do Nascimento (FCT) comparecer a ação formativa e adoecimento da supervisora Angélica Liaño.

A ação formativa sobre os Direitos dos Quilombolas foi agendada para 28 de abril de 2018.

- Conceição de Jacaré

Não foi possível realizar a AF devido à falta de participação efetiva dos pescadores da comunidade de Conceição de Jacaré na Reunião de Retomada, onde apenas um comunitário se identificou como pescador artesanal. A Equipe Executora teve dificuldade de identificar o público prioritário nas Exploratórias e Mobilizações realizadas.

A Comissão Comunitária formada na Reunião de Retomada não se sentiu apta para definir o tema prioritário; na reunião de comissão realizada em 29 de agosto de 2017, os membros presentes reforçaram que seria necessário ter mais pescadores participando para

que o tema prioritário fosse definido, se prontificaram em auxiliar a equipe executora na identificação do público prioritário, sugeriram entrar em contato com a colônia de pesca e secretaria de pesca do município de Mangaratiba para tentar montar uma estratégia para identificar os pescadores de Conceição de Jacareí, conforme consta na memória da reunião de comissão, porém sem avanços.

Até a finalização desse ciclo de Ações Formativas não foi possível identificar outros membros do público prioritário, assim como não foi possível definir o tema prioritário para realizar a Ação Formativa.
